


Införandeprojekt

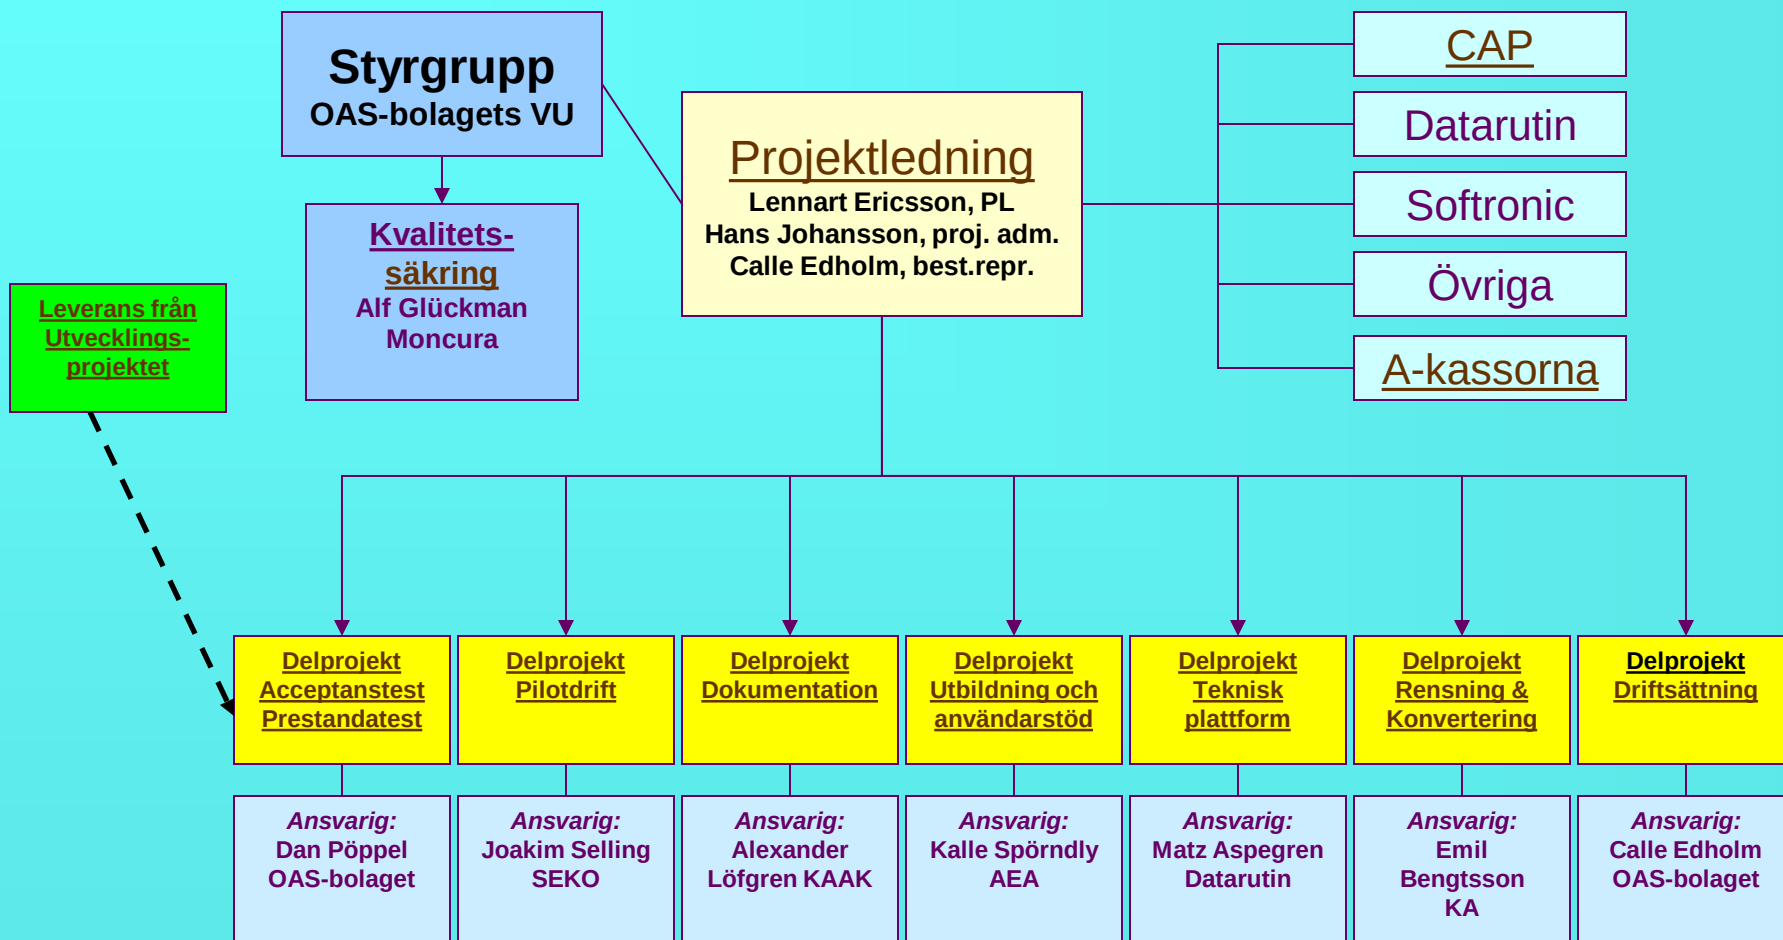

Kvalitetssäkring

- **Kvalitetssäkringsplan**
- **Risikanalys**
- **Granskningar**
- **Uppföljning av planering och kvalitet**
- **Rapporteringar**

Projektledare

- **Ledning, administration**
- **Planering, uppföljning**
- **Samordning**
- **Rapportering**
- **Bevakning av införande på a-kassor**
- **Överlämning till förvaltning**

Driftställen

- **Lokalt projekt** (startmöte, förberedelser, installation, provdrift, skarp drift, avslut)
- **Tidplan, resurser, ekonomi**
- **IT-miljöer/plattform, (provdrift, drift)**
iordningställande

A-kassor

- **Lokalt projekt** (startmöte, förberedelser, rensning, konvertering, lokal utbildning, provdrift, skarp drift, avslut)
- **Behörighetsadministration**
- **Tidplan, resurser, ekonomi**

Utvecklingsprojektet

- **Leverans av system**
- **Leverans av dokumentation**
(systemdokumentation, systembeskrivning)
- **Restlista**

OAS-förvaltning

- **Acceptanstestmiljö, iordningställande**
- **Utbildningsmiljö, iordningställande**
- **Övningsmiljö, iordningställande**
- **Uppgradering av programversioner**
- **Felhantering**
- **Förbättringsförslag**
- **Förvaltningshandbok**

Acceptanstest, prestandatest

- **Iterationstest**
- **Utbildning av acceptanstestare** (testmetod, testfall, testinstruktioner)
- **Acceptanstestmiljö** (beställning, innehåll)
- **Acceptanstest**
- **Prestandatest** (svarstider, batchtider)
- **Acceptans/prestandatestrapport**
- **Acceptanstestgodkännande**

Pilotdrift

- **Pilotdriftplan**
- **Pilotdriftmiljö** (beställning, innehåll)
- **Pilotdriftmiljö iordningställande**
- **Pilotdrift** (installationsanvisning, teknisk plattform, applikation, informationsutbyte, utbildning, dokumentation, behörigheter, helpdesk mm)
- **Pilotdriftsrapport**
- **Leveransgodkännande**

Dokumentation

- **Dokumentationsstrategi**
- **Dokumentationsstruktur, mallar**
- **Användardokumentation** (applikationsansvarig, handläggare, helpdesk/assistans)
- **Driftdokumentation**
- **Installationsdokumentation**
- **Utbildningsmaterial, dokumentation**
- **Rutinbeskrivningar**

Utbildning och användarstöd

- **Utbildningsstrategi**
- **Utbildningslokaler**
- **Utbildningsplan**
- **Utbildnings- & övningsmiljö**
(beställning och innehåll)
- **Förkunskapstest**
- **Utbildning**
(applikationsansvariga, utbildare, handläggare, helpdesk/assistans, driftpersonal, installationspersonal)
- **Utvärdering av utbildningar**
- **Utbildningsrapport**
- **Användarstöd** (tillämpning, applikation, rutiner)

Teknisk plattform

- **Teknikkomponenter**
- **Klientmiljö**
- **Servermiljö**
- **Databasmiljö**
- **Verifieringsmiljö**
- **Teknisk test**
- **Regressionstest**
- **Plattformsrapport**


Rensning & konvertering

- Rensningsinstruktioner
- Rensning av registerinformation
- Konverteringsstrategi
- Konverteringskrav
- Konverteringsregler
- Konverteringsmiljö (beställning, innehåll)
- Konverteringsplan
- Provkonvertering av registerinformation
- Driftkonvertering av registerinformation

Driftsättning

- Informationsplan
- Driftställebevakning/samordning
- Uppföljning o bevakning IT-miljöer/plattform (rensning, konvertering utbildning, övning, pilotdrift, drift)
- Behörighetsrutin uppföljning
- Checklista driftsättning
- Dokumentation införandemodell
- Bevakning rensningsplan
- Lokalt driftstöd

Etappindelning & milstolpar

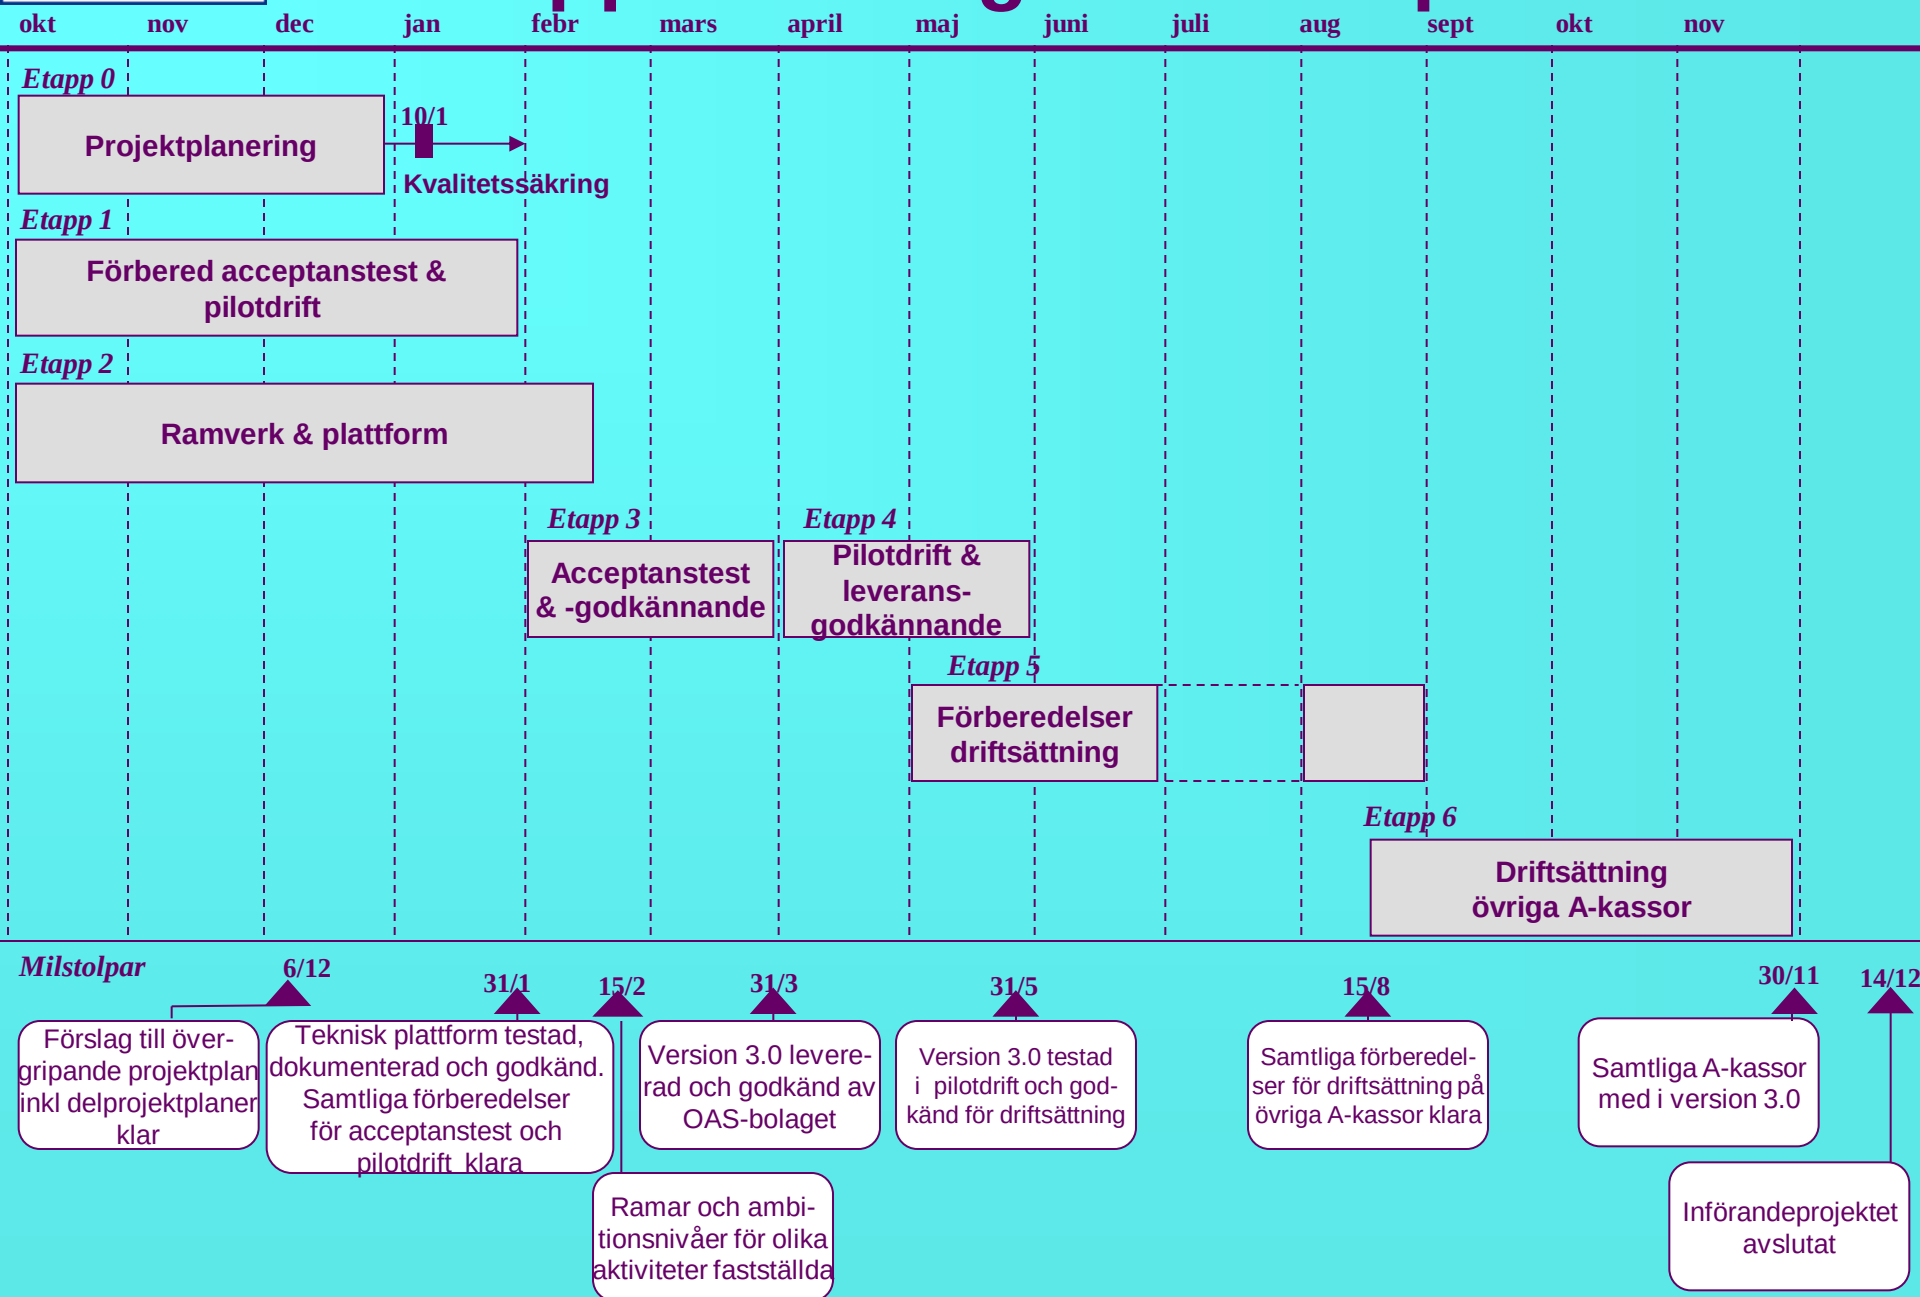


OAS 3 Huvudaktiviteter för införandet lokalt

Efter pilotinförande på SEKO våren 2001 införs den nya versionen under hösten 2001 på samtliga a-kassor.

Riktlinjer lokala projekt

På varje a-kassa har utsetts en lokal projektledare för införandet av OAS 3.0. Varje a-kassa har ett lokalt projekt där etapperna start, rensning, teknikuppgradering och provkonvertering genomförs före sommaren och etappen driftsättning under perioden augusti - november. Driftsättningen sker enligt fastställd driftsättningsplan.

Arbetet sker enligt nedanstående modell.

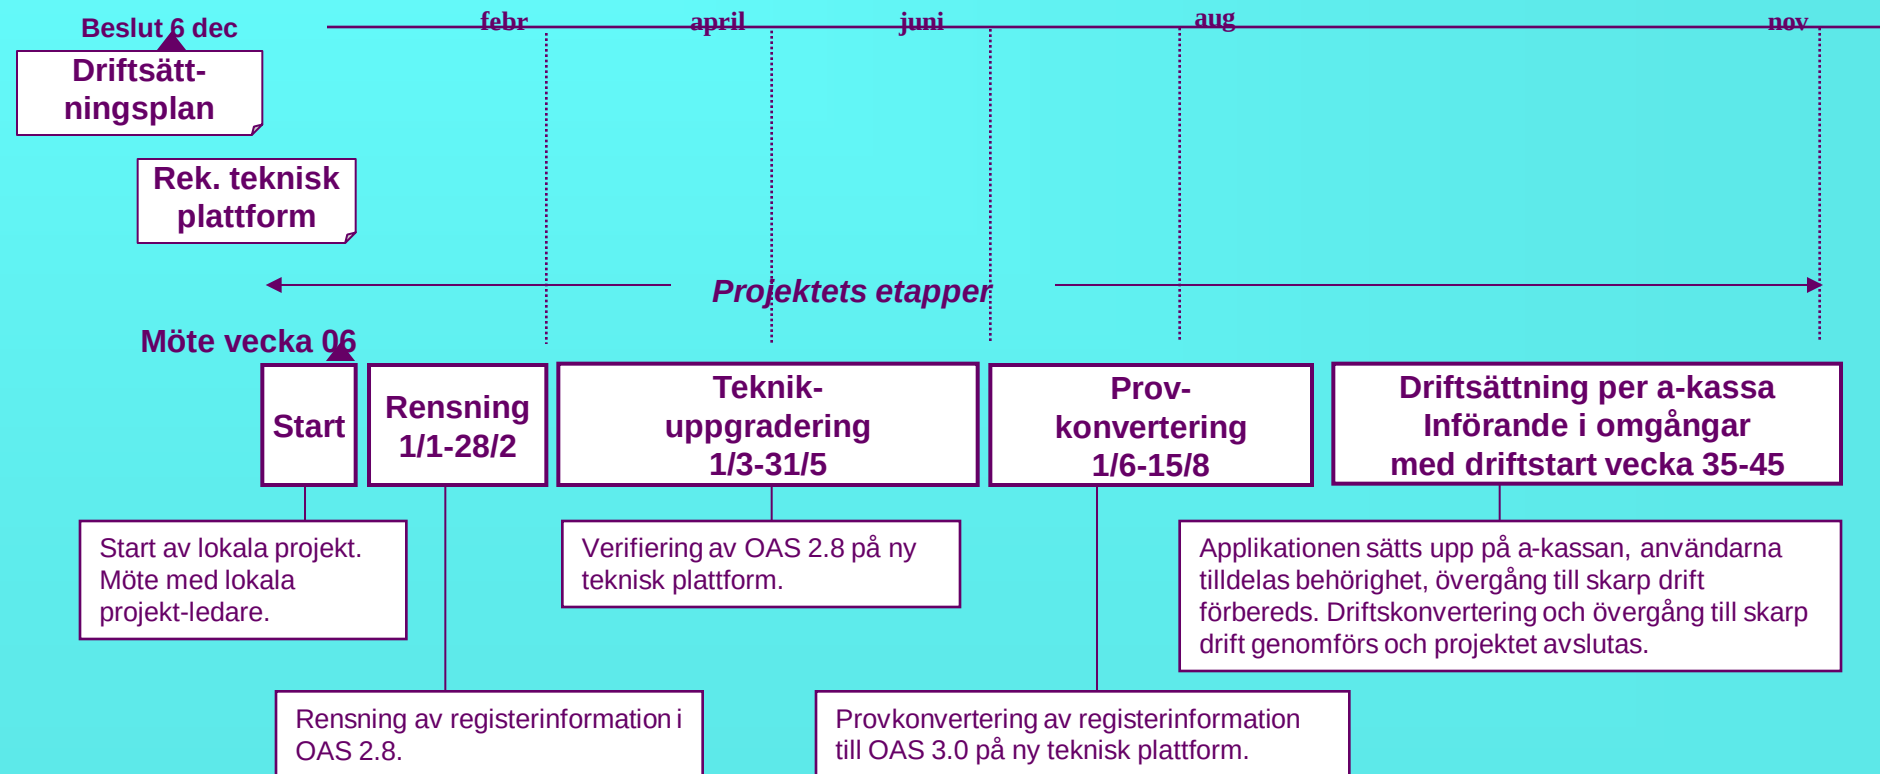

Fördelning av utbildning per vecka

Vecka	Ansvarig	Totalt	Lärare	Assisterer	Stockholm	Östersund	Karlskrona	Borlänge	Visby	Gävle	Göteborg	Halmstad	Jönköping	Kalmar	Växjö	Luleå	Skövde	Lund	Flen	Karlstad	Umeå	Härnösand	Västerås	Borås	Örebro	Linköping
14 Totalt		34			16						8				5							5				
35 Totalt		64	1	4	26	5				2	2				6	2		4				2	2	2	2	4
36 Totalt		98	4	6	76						11															
37 Totalt		162	5	2	68	2	2	4	2	4	9	2	2	2	2	8		11	6	4	6	6	2	2	2	6
38 Totalt		115	9	3	40			4	2	3	6	3	3		2	9	1	14	1	4			2	2	2	5
39 Totalt		95	2	7	86																					
40 Totalt		100		4	34	2		2	1	8	11	2	3	1		3	2	11	2	2	2	4	2	2	2	
41 Totalt		295	5		77	3	9	13	2	18	10	3	3	11	13	9	15	20	15	15	9	8	13	5	7	12
42 Totalt		75	1	7	46			7			5				7											2
43 Totalt		300	13	2	77	4	6	7	20	11	24	6	5	6	4	8	6	30	6	8	13	10	7	8	10	9
45 Totalt		85		4	5		19		19	19														19		
48 Totalt		6	1								5															
Totalt		1429	41	39	551	16	36	37	46	65	91	16	16	20	39	39	24	90	30	33	30	35	28	40	25	38

- **Utbildning för applikationsansvariga**
- **Handläggartutbildning**
- **Grundutbildning OAS 3**
- **Skuldhantering i OAS 3**
- **Bokföring i OAS 3**
- **Utbildning för driftspersonal**
- **Utbildning för personal i 'helpdesk'**
- **Installationspersonal**
- **Utbildning för utbildare och utbildningsassistenter**

Schema för utbildare

- **Pedagogik utbildning: 5, 7, 12, 14, eller 21 mars**
- **Utbildning i OAS 3: 4 dagar under perioden 6 maj – 20 juni**
- **Planering: ca 4 dagar valfritt förlagd under perioden 24 juni – 16 augusti**
- **Utbildning av handläggare: 2-6 dagar 1-2 veckor innan införandet på kassan**

Acceptanstestperioder

- 6/2-8/2
- 13/2-19/2
- 20/2-22/2
- 28/2-3/5
- 6/3-8/3
- 11/3-15/3

Versionshantering

	<u>10-dec-01</u>	<u>20-dec-01</u>	<u>10-jan-02</u>	<u>01-apr-02</u>	<u>01-jun-02</u>	<u>01-jul-02</u>	<u>01-jan-03</u>
OAS 2.8	AMS-anp.	samord. rensning					
OAS 2.8.1			rättning				
OAS 3				3.0 pilotv	3.0 lev	3.1off/sekr	3.2akt.stöd
OAS 2				2.8 mot S12		2.9off/sekr	
Rensningsrutin 1.0	2.8 mot 3.0						
Konverteringsprogram 1.0				2.8 mot 3.0		2.9 mot 3.1	
SOTA 1.6				1.6 mot S12		1.7off/sekr	
SOTA mot OAS 3						mot 3.1	
Akalk 2.2							
Akalk mot OAS 3							
AkassanOnline				mot S12			
AkassanOnline mot OAS 3							
Melos 2				mot S12			
