


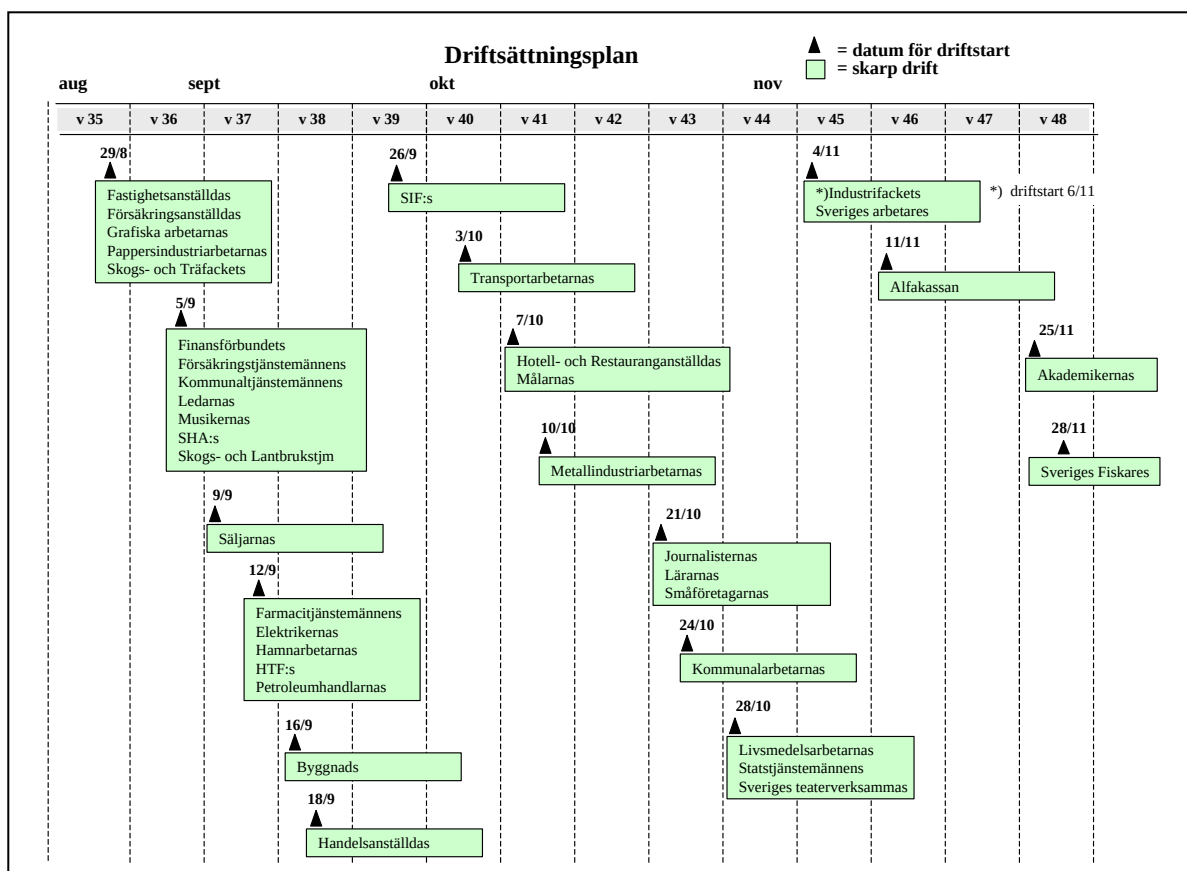

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	2
2 Organisation, arbetssätt och resultat	3
2.1 Etappindelning	3
2.2 Projektorganisation centralt	4
2.3 Projektorganisation lokalt	6
2.4 Planerings- o uppföljningscykeln	7
2.5 Införande på kassorna	8
2.6 Införande på driftställen	9
2.7 Delresultat	10
2.8 Förvaltningsobjekt	11

Bilagor:

Uppföljning av budget

Projektavslutsrapport Dokumentation

Projektavslutsrapport Utbildning & användarstöd

1 Sammanfattning

Införandeprojektet för OAS 3 startade oktober 2001 med aktiviteter för att verifiera den tekniska plattformen för OAS 3, under november 2001 startade planeringsaktiviteter för hela Införandeprojektet och under november/december 2001 startade de olika delprojekten. Driftsättningsplanen/Införandepånen godkändes vid delägarbötet den 6 december 2001. Projektbeskrivningen för projektet fastställdes vid OAS-bolagets styrelsemöte den 15 januari 2002. Arbetet kommer att bedrivas till den 13 december 2002 då OAS 3 är driftsatt på alla a-kassor (38 st) och driftställen (6 st) och sista utbildningen genomförs.

Införandeprojektet har levererat cirka 5.000 utbildningsdagar. I uppgiften har ingått att utbilda flera målgrupper i OAS 3, projektet har utbildat 70 applikationsansvariga, 105 lärare/assistenter, 1.300 handläggare (OAS bas), 170 handläggare med särskilda arbetsuppgifter (bokföring och skuldhantering) och 30 nya handläggare (OAS grund). Vidare har registerinformation för cirka 4 miljoner medlemmar konverterats från OAS 2 till OAS 3.

Avvikelser

Försenade leveranser från utvecklingsprojektet av systemet och bristande dokumentation har medfört att acceptanstesten och pilotdriften förlängdes, leveransgodkännande lämnades den 14 augusti 2002 i stället för som planerat i maj 2002. En konsekvens av bristande dokumentation (tjänstebeskrivning m m) är att utveckling och test av konverteringsprogrammet försenades, en annan konsekvens är att gränssnitt med kringssystem ej kunnat anpassas som planerat.


Kostnaden för utveckling och test av konverteringsprogram blev cirka 5 miljoner kr mot planerat 1,5 miljoner kr.

Projektledningen vill i denna projektavslutsrapport kort beskriva hur projektet planerats, styrts, följts upp och vilka resultat projektet åstadkommit.

Bakom denna korta beskrivning finns en mängd dokumentation och erfarenheter av hur ett systeminförande av denna storlek bör hanteras.

För att tillföra våra erfarenheter till kommande införandeprojekt, kommer detta material samt en sammanfattning av delresultat från de olika delprojekten att tillställas SO/OAS-bolaget.

Figuren visar driftställe för respektive a-kassa.



2 Organisation, arbetssätt och resultat

2.1 Etappindelning

Införandeprojektet delades in i ett antal etapper i den projektbeskrivning som togs fram under projektplaneringen.

För varje ansvarsområde/delprojekt fastställdes i projektbeskrivningen de resultat som skulle uppnås under respektive etapp.

Dessutom fastställdes ett gemensamt, övergripande mål för etappen.

Under projektets gång har resultaten anpassats till det aktuella läget i projektet men intentionerna i projektbeskrivningen har i stort sett kunnat följas.

Målen och huvudresultat för respektive etapp kan sammanfattas enligt följande:

Etapp 1 – Planering, riktlinjer och plattform

Ramverk och plattform för införandet av OAS 3 klart. Strategier/riktlinjer för olika delprojekt som underlag för fortsatt arbete klara.

Etapp 2 – Acceptanstest och rensning

OAS 3 acceptanstestgodkänt för pilotdrift. Rensning av registerinformation klar på samtliga a-kassor.

Etapp 3 - Pilotdrift och utbildning

OAS 3 leveransgodkänt för driftsättning på samtliga a-kassor. Pilotutbildning utvärderad och utbildning för övriga a-kassor påbörjad.

Etapp 4 – Provkonvertering och utbildning

Samtliga förberedelser för driftsättningen av OAS 3 klara. Utbildning av utbildare klar.


Etapp 5 – Utbildning och driftsättning

OAS 3 i drift på samtliga a-kassor. Införandeprojektet avvecklas. Handläggare på samtliga a-kassor samt drift- och helpdeskpersonal utbildade samordnat med driftsättningsplanen.

Hela projektet från etapp 1 till etapp 5 har följt genomförandeplanen i projektbeskrivningen med undantag av att pilotdriften avslutades och leveransgodkännande lämnades den 14 augusti 2002 i stället för som planerat i maj 2002.

Förseningarna berodde på att projektet fick invänta leveranser från Utvecklingsprojektet som var försenade.

Nedan visas de ingående etapperna.




2.2 Projektorganisation centralt

Införandeprojektet har varit organiserat och bemannat på två olika sätt beroende på projektets huvudarbetsuppgifter.


Under etapp 1-4 var huvudarbetsuppgifterna att förbereda driftsättningen på kassor och driftställen och under etapp 5 var huvudarbetsuppgifterna att genomföra driftsättningen, ge support till utbildare och a-kassor samt att överlämna till förvaltning.

Nedan visas projektorganisationen under etapp 1-4.

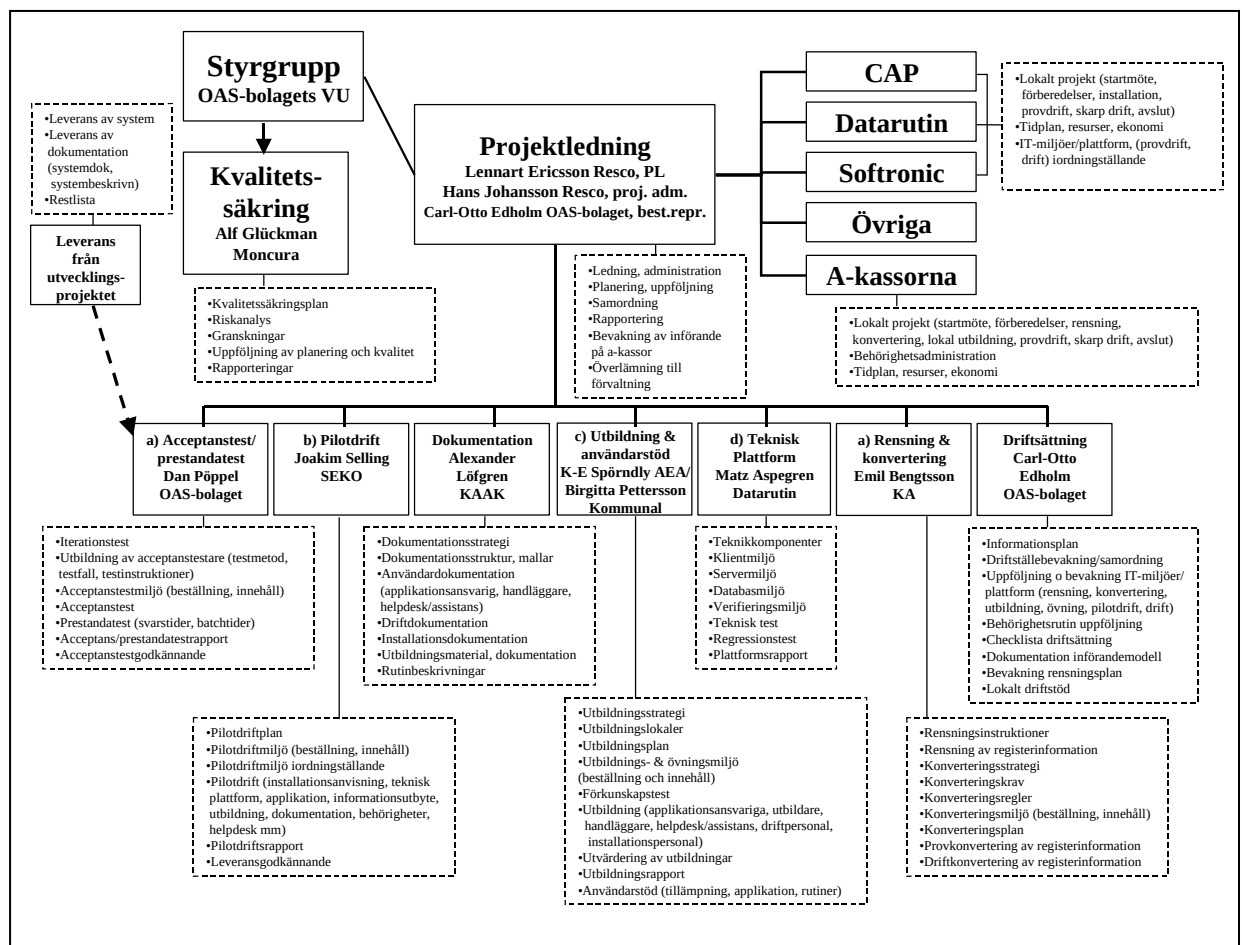


- a) Ingår från etapp 5 i delprojekt Driftsättning.
- b) Delprojektet avslutat i och med etapp 4.
- c) Karl-Eric Spörndly delprojektledare t o m etapp 3,
Birgitta Pettersson delprojektledare fr o m etapp 4.
- d) Ingår från etapp 2 i delprojekt Driftsättning.

Figuren visar översiktligt ansvarsfördelningen mellan Införandeprojektet, Supportorganisationen på SO, OAS-bolaget Förvaltning OAS 3 och OAS-förvaltningen under etapp 5.

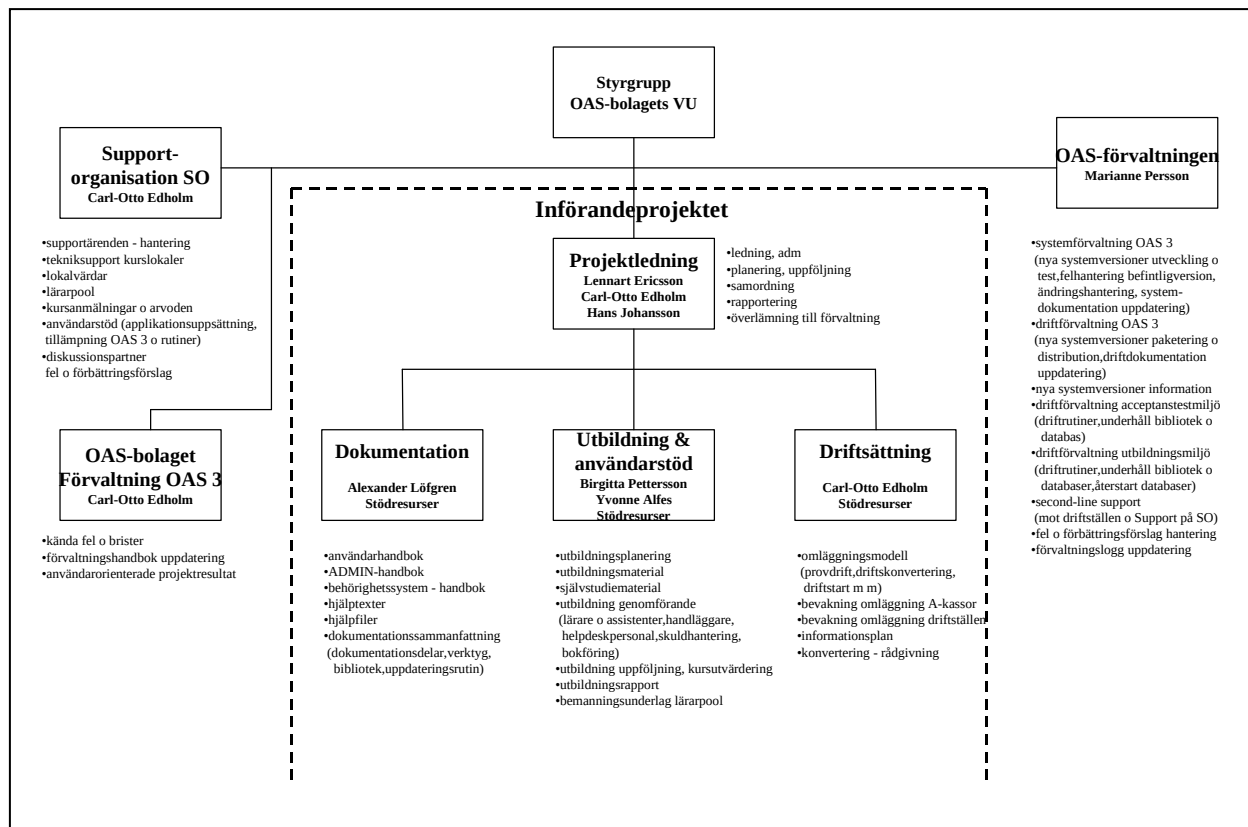

2.3 Projektorganisation lokalt

På a-kassorna och respektive driftställe har följande modell tillämpats för lokala införande-
projekt, nedanstående figur visar hur ett lokalt införandeprojekt var uppbyggt och hur
stödet från det centrala projektet var organiserat.

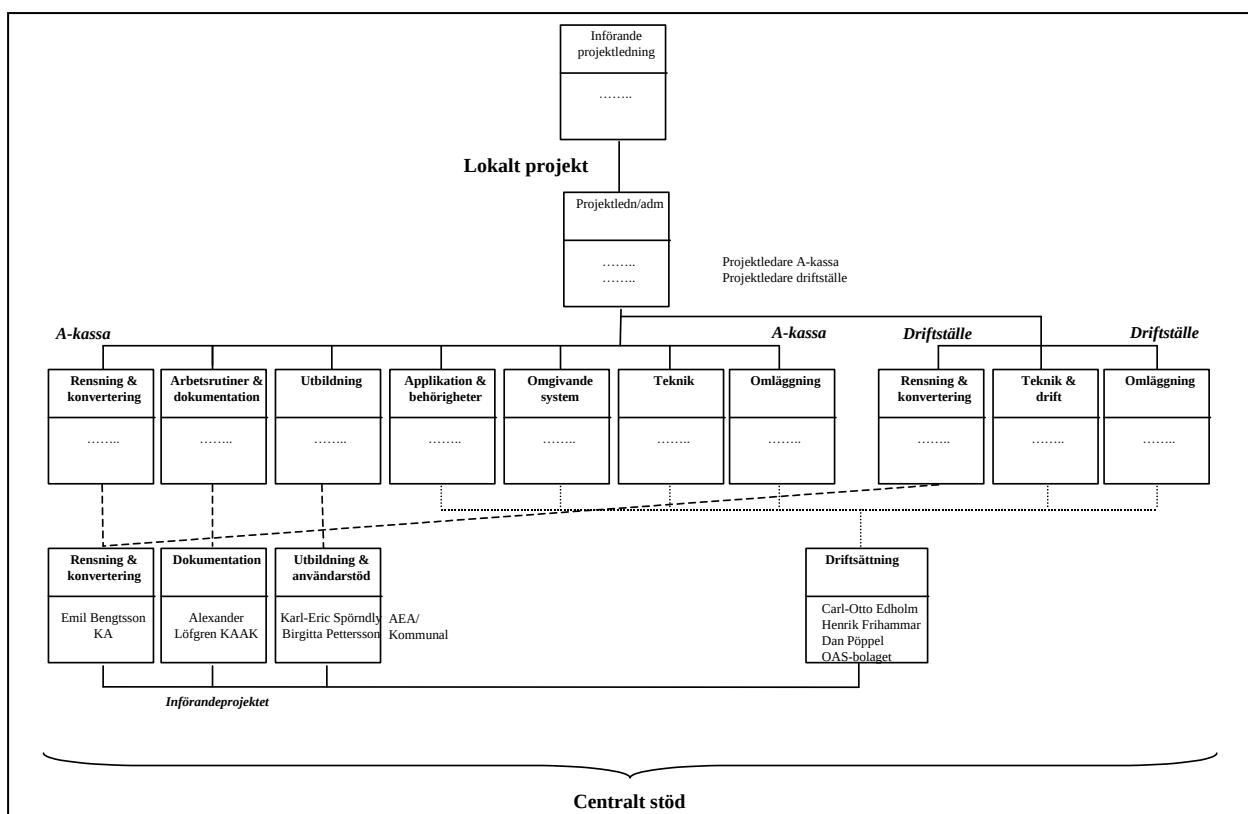

2.4 Planerings- o uppföljningscykeln

Styrningsmodellen för projektet är baserad på den modell som arbetades fram i samband med att Kommunals nya medlemssystem infördes 1998-1999.

Arbetet startade som tidigare nämnts med att en projektbeskrivning och grov plan för arbetet togs fram. Planen bröts sedan ner på aktivitetsnivå.


Uppföljningen av planerna har sedan gjorts genom regelbundna, protokollförda projektledningsmöten där projektledning och delprojektledare i Införandeprojektet. deltagit. En restlista med ”öppna punkter” har också gåtts igenom och åtgärdats.

Rapportering har därefter gjorts till OAS-bolagets VU projektets styrgrupp i en samlad projektstatusrapport. Rapporten har varit fokuserad på att beskriva avvikelser mot gällande planer och budgetutfall.

Budget och resultat för kommande etapp har också fastställts av OAS-bolagets VU.

Total resursåtgång för projektet från oktober 2001 till den 13 december 2002 är ca 9.900 konsulttimmar.

Dessutom har resursinsatsen från a-kassor och SO varit ca 20.000 timmar.

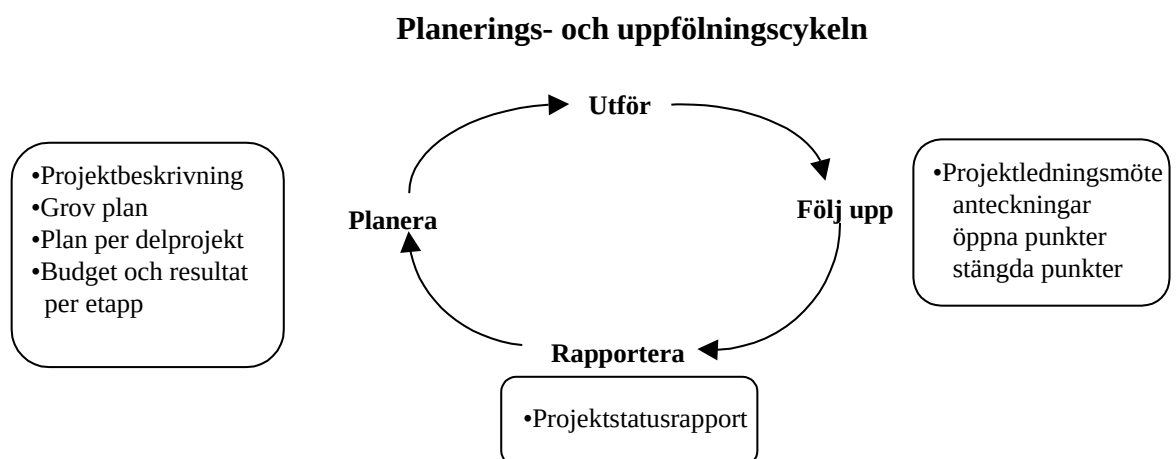

2.5 Införande på kassorna

Efter pilotinförande på SEKO har OAS 3 successivt införts på samtliga a-kassor under perioden augusti - november. A-kassorna har i samråd med driftställena delats in i ett antal driftsättningsomgångar. Varje a-kassa har genomfört ett lokalt projekt, som fått centralt stöd med erfarenheter och kunskaper. Varje lokalt projekt har delats in i fem etapper; rensning, provkonvertering, provdrift, utbildning & utvärdering och driftstart.

I rensning har ingått att både manuellt och maskinellt ta bort icke aktuell registerinformation i OAS 2.

I provkonvertering har ingått att sätta upp applikationen och på prov föra över registerinformation från OAS 2 till OAS 3.

I provdriften har ingått att köra systemet under verkliga förhållanden och säkerställa samband med kringsystem.

I utbildning & utvärdering har ingått att bevaka att utbildningen inklusive självstudier genomförs som planerat.

I driftstart har ingått att verifiera driftkonvertering, omläggning till skarp drift enligt omlägningsplan samt koppla behörigheter för samtliga användare till en behörighetsprofil. Efter driftstarten har den lokala projektorganisationen övergått till ordinarie förvaltning.


För att skapa förutsättningar för ett gemensamt arbetssätt för de lokala projekten arbetades en projektledarpärm fram. Erfarenheterna från pilotinförandet på SEKO var bl a underlag till pärmen. Den lokale projektledaren (OAS-generalen) har ansvarat för att modell och arbetssätt följts.

För att säkerställa arbetsuppgifter, planering och ansvar samt hur de lokala projekten på a-kassorna, på driftställena och det centrala projektet ska samarbeta har tre gemensamma längre möten genomförts för lokala projektledare:

- Den 7 februari i Förbundshusets plenisal, Stockholm där projektledarpärmen delades ut och arbetsmodellen förankrades.
- Den 18-19 mars på Metalls kursgård, Skåvsjöholm där det lokala projektets ansvar och aktiviteter gicks igenom samt rutinen för rapportering till det centrala projektet.
- Den 21-22 augusti på Metalls kursgård, Skåvsjöholm där omlägningsmodellen, omlägningsplanen och rapporteringsrutinen för omläggningen stämades av.

Dessutom har kortare möten hållits med jämna mellanrum. Vidare har veckobrev skickats ut till de lokala projektledarna med information och instruktioner.

Nedanstående skiss visar översiktligt arbetssättet i ett lokalt projekt.

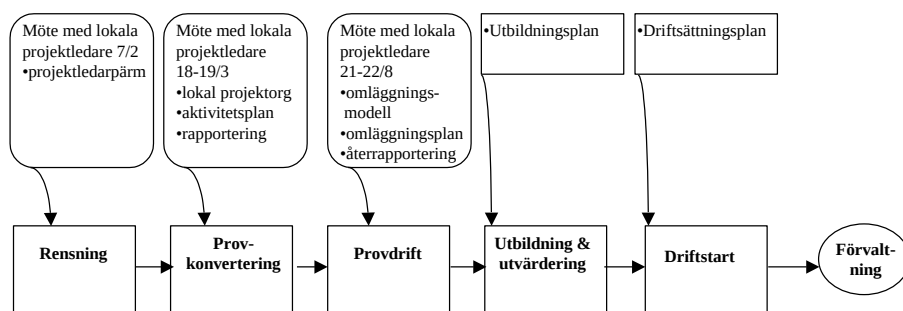

2.6 Införande på driftställena

Efter pilotinförande på Datarutin för SEKOs a-kassa har OAS 3 successivt införts på sex driftställen (Datarutin, CAP, Softronic, DR Media, Transport och Metall) under perioden augusti - november. Datarutin och CAP har i samråd med SO och "sina" a-kassor delat in i dessa i ett antal driftsättningsomgångar med en eller flera a-kassor i varje omgång. Övriga driftställen sköter driften för en a-kassa vardera.

Varje lokalt projekt har delats in i fem etapper; rensning, provkonvertering, provdrift, driftkonvertering & omställning och driftstart.

I rensning har ingått att köra maskinell rensning i OAS 2.

I provkonvertering har ingått att köra provkonverteringar och anpassa drifrutiner.

I provdriften har ingått att köra systemet under verkliga förhållanden och stämma av batchkörningar.

I driftkonvertering & omställning har ingått att köra driftkonvertering och köra avslutande batchkörningar i OAS 2.


I driftstart har ingått att iordningställa driftsmiljön, genomföra omläggning till skarp drift samt ikappkörning av batchar i OAS 3.

Den lokale projektledaren (driftansvarige) på respektive driftställe har ansvarat för att modell och arbetssätt följts.

Vidare har delprojekt Driftsättning haft regelbundna avstämningsmöten med driftställena.


När det gäller övergång till ordinarie förvaltning, arbetssätt och längre gemensamma möten se 2.5 Införande på kassorna.

Nedanstående skiss visar översiktligt arbetssättet i ett lokalt projekt.

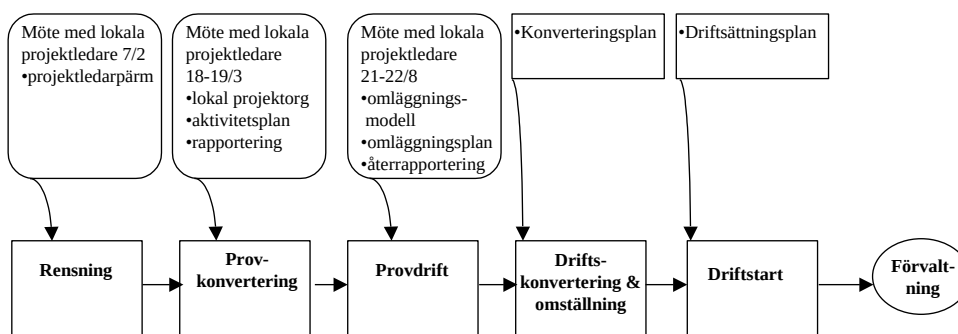

2.7 Delresultat

I projektbeskrivningen för Införandeprojektet finns ett antal ansvarsområden och delresultat definierade. Skissen nedan visar dessa olika ansvarsområden och delresultat som projektet producerat. Ansvarsområdena följer i stort projektorganisationen.

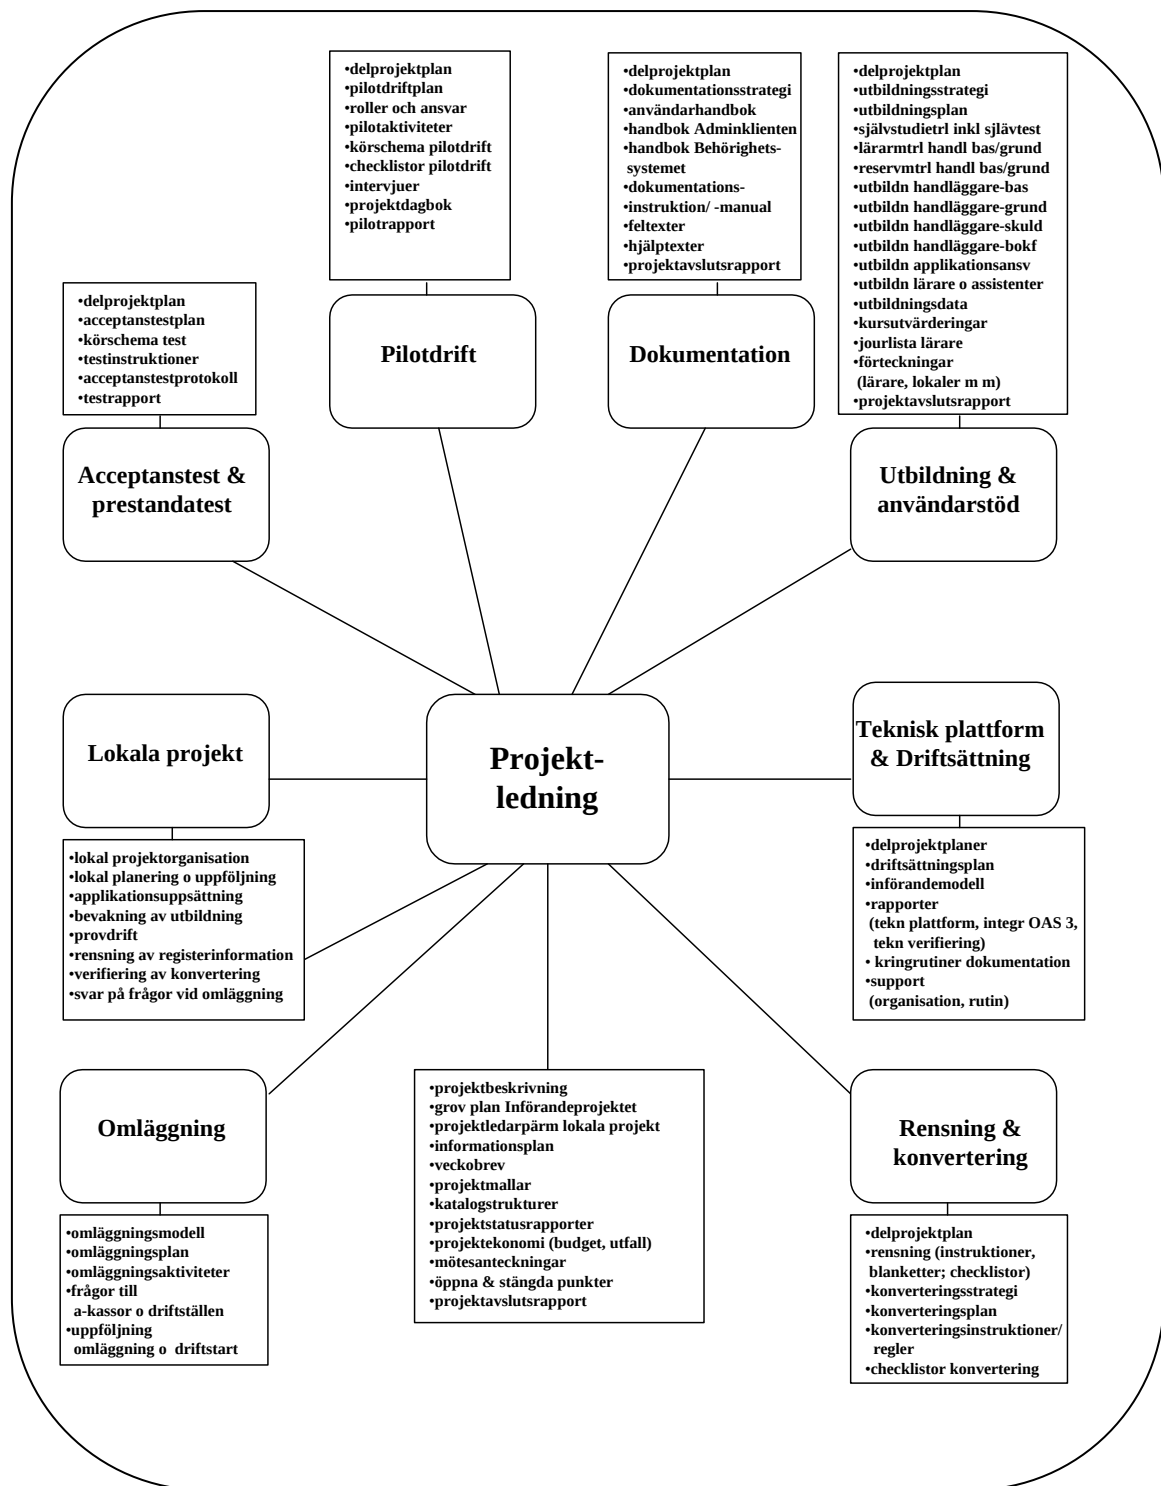

2.8 Förvaltningsobjekt

Tabellen nedan visar nytillkomna förvaltningsobjekt (projektresultat) i OAS 3 jämfört med OAS 2 vilka ska förvaltas av SO/OAS-bolaget.

Förvaltningsobjekt	Syfte
Användarhandbok	Noteshandboken för OAS 3 vänder sig till mot handläggarna. Handboken ska alltid hållas uppdaterad och gå i takt med aktuell OAS 3-version. Handboken består av ett antal olika delar/kapitel som beskriver olika delar av systemet men också belyser systemet från olika håll.
Handbok Adminklienten	Handboken för Adminklienten vänder sig i första hand till A-kassornas Applikationsansvariga. Handboken för Adminklienten ska förklara och beskriva Administrationsklienten för OAS 3.
Handbok Behörighetssystemet	Handboken för Behörighetssystemet vänder sig till A-kassornas Applikationsansvariga. Handboken ska förklara och beskriva Behörighetssystemet.
Dokumentations- instruktion/-manual	Dokumentationsinstruktionen/-manualen vänder sig till den organisation/person som ska förvalta handböckerna för OAS 3. Instruktionen/Manualen ska förklara handböckernas uppbyggnad, valda standards såsom teckensnitt och tecken- och bildstorlekar, bilbehandlingsteknik osv.
Feltexter	Feltexter i systemet då handläggaren t ex utfört något registreringsfel eller då annat fel uppstått.
Hjälptexter	Funktionen kallad "Ogiltig syntax" i själva systemet. Då användaren klickar på vissa fält i OAS-klienten kommer en ruta upp där kort hjälp/information kan lämnas. Exempelvis kan information lämnas om vilka tillåtna värden som får fyllas i inom ett fält.
Självstudiematerial	Syftet med självstudiematerialet är att ge de personer som ska delta i handläggarutbildningar möjlighet att, innan kursen, bekanta sig med OAS 3s utseende och lära sig grundläggande funktioner. Detta för att möjliggöra en effektiv användning av tiden under den lärarledda utbildningen. En beskrivning av hur självstudieprogrammet startas har tagits fram som komplement till självstudiematerialet.
Lärarmaterial Handläggare Bas/Grund	Syftet med lärarmaterialet är att vara ett stöd för läraren före, under och efter varje utbildningstillfälle. Det innehåller både allmänna tips/råd och rekommendationer i hur OAS 3-utbildningen bör bedrivas.
Reservmaterial Handläggare Bas/Grund	Reservmaterialet ska användas då driftstörningar inträffar under utbildningen.

Förvaltningsobjekt	Syfte
Utbildning Handläggare - Bas	Syftet med utbildningen är att ge kunskaper om OAS 3 för handläggare på A-kassor. Utbildningen har förutsatt kunskaper om och erfarenhet av arbete i OAS 2.7.
Utbildning Handläggare - Grund	Syftet med utbildningen är att ge kunskaper om OAS 3 för nyanställda handläggare på A-kassor.
Utbildning Handläggare – Skuldhantering	Syftet med utbildningen är att ge kunskaper om efterhanteringen av beslutade återkrav av utbetald arbetslöshetsersättning i OAS 3. Utbildningen tar upp hur återkrav hanteras med avseende på avbetalningsplaner, eftergift mm. Dessutom tar utbildningen upp hur återkrav påverkar statsbidragsansökan, kontrolluppgifter och bokföringsunderlag.
Utbildning Handläggare – Bokföring	Syftet med utbildningen är att ge kunskaper om OAS 3 för personer som arbetar med bokföring på A-kassor.
Utbildning Applikations- ansvariga	Syftet med utbildningen är att ge applikationsansvariga på A-kassor kunskaper om Admin-klienten, Behörighetsystemet, batchkörningar, skapa brevmallar mm.
Utbildning - Lärare och assistenter	För att kunna genomföra det stora antal utbildningar som krävts under införande tiden har ca 100 lärare och assistenter utbildats. Dessa personer har sin anställning på någon A-kassa.
Utbildningsdata	Utgöra underlag för övningsuppgifter under Utbildning Handläggare – grund, Utbildning Handläggare – skuldhantering och Utbildning Handläggare - Bokföring.
