

Delprojektet

Utbildning och användarstöd

Slutrapport



OAS-bolaget
Införandeprojektet

Utfärdare
Birgitta Pettersson/Yvonne Alfes

Slutrapport - Preliminär
Delprojekt utbildning och användarstöd

Utskriftsdatum
2002-12-03



2002-12-03

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN	5
1.1	UPPDRAGET	5
1.2	PROJEKTET, TID, RESURSER OCH KOSTNADER	6
1.3	UTVÄRDERING	6
1.4	ERFARENHETER/REKOMMENDATION	6
2	BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR	7
3	UPPFÖLJNING AV UPPDRAGET	7
3.1	LOKALER	7
3.2	UTBILDNINGSMILJÖ	8
3.2.1	<i>Kommentar</i>	<i>8</i>
3.3	UTBILDNINGSPLANERING.....	9
3.3.1	<i>Antal utbildningstillfällen på varje ort</i>	<i>9</i>
3.3.2	<i>Tillsätta lärare och assistenter till varje utbildning</i>	<i>9</i>
3.3.2.1	<i>Kommentar</i>	<i>9</i>
3.3.3	<i>Upprätta jourlista för lärare och assistenter</i>	<i>9</i>
3.3.3.1	<i>Kommentar</i>	<i>10</i>
3.3.4	<i>Administration</i>	<i>10</i>
3.4	UTBILDNINGSMATERIAL	10
3.4.1	<i>Självstudiematerial</i>	<i>10</i>
3.4.1.1	<i>Kommentar</i>	<i>11</i>
3.4.2	<i>Utbildningsmaterial för handläggare.....</i>	<i>11</i>
3.4.3	<i>Lärarpärm/CD.....</i>	<i>11</i>
3.5	GENOMFÖRANDE AV UTBILDNINGAR	12
3.5.1	<i>Applikationsansvariga</i>	<i>12</i>
3.5.2	<i>Utbildning för utbildare inom delprojektet (lärare och assistenter) ..</i>	<i>12</i>
3.5.3	<i>Utbildning av handläggare OAS Bas</i>	<i>13</i>
3.5.4	<i>Utbildning av handläggare med särskilda arbetsuppgifter</i>	<i>13</i>
3.5.5	<i>Grundutbildning</i>	<i>14</i>
3.5.6	<i>Sammanställning av antalet utbildningar</i>	<i>15</i>
3.6	UTVÄRDERING OAS BAS.....	16
3.6.1	<i>Allmänt.....</i>	<i>16</i>
3.6.2	<i>Resultat Självstudiematerialet.....</i>	<i>17</i>
3.6.2.1	<i>Kommentar till frågorna om självstudiematerialet</i>	<i>17</i>
3.6.3	<i>Resultat Lärarledd utbildning</i>	<i>17</i>
3.6.3.1	<i>Kommentar till frågorna om den lärarledda utbildningen</i>	<i>18</i>

3.6.4	Resultat Administration/Service	18
3.6.4.1	Kommentarer till administration/service före kursen.....	18
3.7	UTVÄRDERING PEDAGOGIKUTBILDNING.....	18
3.7.1.1	Kommentar	19
4	UPPFÖLJNING AV PROJEKTET.....	19
4.1	TID, RESURSER OCH KOSTNADER	19
4.1.1	Kommentarer.....	19
4.1.1.1	Ettapp 2	19
4.1.1.2	Ettapp 3	19
4.1.1.3	Ettapp 4	19
4.2	ORGANISATION/SAMARBETE OCH ARBETSSÄTT.....	20
5	REKOMMENDATIONER.....	20
6	REFERENSMATERIAL	21

1 Sammanfattning av rapporten

1.1 Uppdraget

Delprojekt utbildning/användarstöd har haft som uppdrag att inom ramen för införandeprojektet OAS 3, se till att utarbeta/genomföra en utbildningsplan för de personer som i sitt dagliga arbete använder befintligt OAS-system och som kommer att beröras av utbytet, ca 1650 personer, varav den största gruppen är handläggare på 38 arbetslöshetskassor runt om i Sverige.

I uppdraget har också ingått att, utifrån fastställd utbildningsplan se till att utbildningslokaler utrustade enligt de krav OAS3 ställer finns tillgängliga i god tid innan respektive utbildning och att ta fram utbildningsmaterial till utbildningarna. Utbildningsmaterialet har bestått av ett självstudiematerial (framtaget för att höja förkunskaperna inför den lärarledda utbildningen) samt utbildningsmaterial med övningsexempel som använts vid den lärarledda utbildningen.

Sammanställningen nedan visar de utbildningar som delprojektet genomfört. Inga handläggarutbildningar har ställts in utan alla utbildningar har kunnat hållas enligt lagd plan!

Projektet har genomfört ca 5000 utbildningsdagar fördelade enligt tabellen nedan.

Typ av utbildning	Omfattning (dagar)	Antal utbildningar	Antal deltagare	Kommentar
Applikationsansvarig Grund + påbyggnad	2 + 2	2 + 6	70	
Utbildare inom delprojektet Grund + påbyggnad Lärare/assistenter	2 + 3	6 + 4	105	
Pedagogik	1 (förlängd dag)	6	50	
Handläggare OAS Bas	3	140	1300	Inklusive Alfakassan och Industrifacket, ca 200 personer. Tre dagar fördelade på en heldags självstudier samt två lärarledd med utbildning
Handläggare med särskilda arbetsuppgifter				
- Bokföring	1	8	70	
- Skuldhantering	1	11	100	
Grundutbildning	3	3	30	

För utbildning av handläggare har Kommunalarbetsförbundets utbildningslokaler på 18 orter i landet utnyttjats. I Stockholm har utbildningar genomförts i lokaler hos SO, Datarutin samt på Kommunalarbetsförbundets huvudkontor. Kommunalarbetsförbundet har i de fall det behövts investerat i nya datorer i sina utbildningslokaler inför OAS 3 utbildningarna

1.2 Projektet, tid, resurser och kostnader

Nedan presenteras en sammanställning av det preliminära utfallet av kostnader för delprojektet. Kostnaderna ligger inom ramen för lagd budget.

Preliminärt utfall												
	Ettapp 1		Ettapp 2		Ettapp 3		Ettapp 4		Ettapp 5		Totalt	
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall
Externa konsulttimmar, Resco			0	50	170	200	190	220	375	375	735	845
Externa konsulttimmar, Datarutin			100	69	370	251	125	220	10	36	605	576
Externa konsulttimmar, Active Solution					0	59	150	228	0	81	150	368
Summa			100	119	540	510	465	668	385	492	1 490	1 789
SO/OAS-resurser (timmar)	0	24	30	10	280	200	250	560	830	410	1 390	1 204
Resurser från A-kassorna (timmar)	120	95	810	431	2 235	597	1 400	1 880	6 900	5 500	11 465	8 503
Kostnader (tkr)	0	0	130	275	250	88	685	264	1 770	1 400	2 835	2 027

1.3 Utvärdering

I samband med utbildningarna för handledare OAS Bas har utvärderingar från 26 utbildningstillfällen slumpmässigt begärts in under veckorna 35-43. Resultatet av utvärderingen grundar sig på 168 svar.

Resultaten från utvärderingarna visar handledarna har upplevt att lärare och assistenter varit mycket kompetenta och att det framtagna självstudiematerialet varit uppskattat av de flesta.

En utvärdering har också gjorts av hur man upplevde utbildningen i pedagogik. Utvärderingen har ett enhälligt svar att man upplevt att utbildningen givit dem tips och idéer på hur de skulle genomföra utbildningarna på bästa sätt.

1.4 Erfarenheter/rekommendation

Varje a-kassa har i och med den satsning som gjorts på lärare och assistenter höjt kunskapsnivån både avseende OAS3 och för lärarna även allmänna pedagogiska kunskaper. Det är viktigt att ta tillvara denna kompetens. Dessa personer måste kunna ses som resurser som SO skulle kunna ta anlitat vid tex. fortsatt utvecklingsarbete av OAS 3

När det gäller utbildning för den stora gruppen handledare i det nya systemet OAS 3, kan man också se att strategin med att inför den lärarledda utbildningen ha läst in ett självstudiematerial har upplevts som ett bra sätt att ha fått vissa förkunskaper vilket underlättat själva inläringen.

2 Bakgrund och förutsättningar

Samtliga Sveriges 38 arbetslöshetskassor administrerar idag utbetalningarna av arbetslöshetsersättning med hjälp av ett verksamhetsstödjande IT-system kallat OAS (obligatoriskt a-kassesystem). Under 2002 skall det befintliga systemet bytas ut mot ett nytt system, OAS 3.

På a-kassorna finns ca 1650 personer, varav den största gruppen är handläggare, som i sitt dagliga arbete använder nuvarande system och som kommer att beröras av utbytet. En förutsättning för införandet har därför varit att dessa personer skulle få den utbildning som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter i OAS 3 innan den egna a-kassan tog OAS 3 i drift.

För att hantera denna omfattande utbildningsinsats startades delprojektet Utbildning och användarstöd inom ramen för Införandeprojektet. Följande målgrupper har delprojektet haft ansvar för att utbilda:

- ⇒ Applikationsansvariga
- ⇒ Utbildare inom delprojektet (lärare och assistenter)
- ⇒ Handläggare på a-kassorna
- ⇒ Handläggare på a-kassorna med särskilda arbetsuppgifter (skuld –bokföring)
- ⇒ Grundutbildning för ”nya” handläggare på a-kassorna.
- ⇒ Driftspersonal
- ⇒ Installationspersonal
- ⇒ Personal i ”helpdesk”

3 Uppföljning av uppdraget

Uppdraget har delats in i följande huvudområden:

- ⇒ Lokaler
- ⇒ Utbildningsmiljö
- ⇒ Utbildningsplanering
- ⇒ Utbildningsmaterial
- ⇒ Genomförande av utbildningar

3.1 Lokaler

I uppdraget har ingått att, utifrån fastställd utbildningsplan se till att utbildningslokaler utrustade enligt de krav OAS3 ställer finns tillgängliga i god tid innan respektive utbildning.

För utbildning av handläggare har Kommunalarbetsförbundets utbildningslokaler på 18 orter i landet utnyttjats. I Stockholm har utbildningar genomförts i lokaler hos SO, Datarutin samt på Kommunalarbetsförbundets huvudkontor.

Utbildningarna har i möjligaste mån förlagts där a-kassorna har uttryckt önskemål om att få sin personal utbildad. Det har gjort att a-kassorna har kunnat hålla nere sina kostnader avsevärt,

bland annat resekostnader, om man jämför med att utbildningarna skulle ha varit koncentrerade till ett ställe, t ex Stockholm.

För att säkerhetsställa att utbildningslokalerna var utrustade enligt de krav OAS 3 ställer gjordes en inventering av utrustningen i samtliga utbildningslokaler.

Kommunalarbetsförbundet har i de fall det behövts investerat i nya datorer i sina utbildningslokaler inför OAS 3 utbildningarna

Delprojektet har i samarbete med Kommunalarbetsförbundets lokala avdelningar ute i landet utsett en värd till varje utbildningslokal. Syftet var att ha en kontaktperson som skulle vara ett stöd till de lärare som skulle hålla utbildningar och även att vara en kontaktperson mot SO om eventuella problem skulle uppstå i samband med utbildningarna. För att tydliggöra vad uppdraget som värd innebar togs även en checklista fram.

3.2 Utbildningsmiljö

Delprojektet har i samarbete med Datarutin iordningställt ett antal utbildningsdatabaser, bland annat för att i samband med utbildningarnas kursdeltagarna skulle ges möjlighet till praktiska övningar vid utbildningstillfällena.

Som grund till utbildningsdatabaserna har en s- k masterversion skapats. Den Databaserna har till viss del bestått av autentiska uppgifter som har avidentifieras för att undvika sekretessproblem. Den har även dessutom bestått av fingerade uppgifter.

Masterversionen har mångfaldigats, dels för att möjliggöra att utbildningar skulle kunna hållas parallellt, har databaserna mångfaldigats i flera exemplar dels för att samma grundmaterial skulle kunna användas vid samtliga utbildningstillfällen.

Skall man ev. förklara vad begreppet masterversioner innebär ???

Schema för återstart av mastersversioner har tagits fram. Ansvar för återstart av mastersversioner har legat på Datarutin.

3.2.1 Kommentar

Vid utbildningarna under veckorna 35-36 uppstod en del problem. Det visade sig att orsaken var att utbildningsdatabasen var korrupt. Projektet stod då i en mycket akut situation att tillsammans med Datarutin få fram en ny mastersversion med rätt data i utbildningsdatabasen. En grupp bestående av utbildare från Kommunalarbetsförbundets a-kassa, projektledare, konsult Resco, tidigare projektledare Carl-Eric Spörndly samt Lena Liljekvist från Datarutin åtog sig arbetet att skapa en ny mastersversion, vilket utfördes under ett längre ”kvällspass”. Datarutin beslutade också att lägga utbildningsdatabasen på en egen server. Efter dessa åtgärder var problemet löst.

3.3 Utbildningsplanering

Utifrån tidigare gjord kartläggning över antalet personer som skulle utbildas på varje a-kassa samt respektive a-kassas önskemål om var i landet utbildningen skulle äga rum påbörjades den omfattande planeringen med att fastställa utbildningsplanen.

~~Skall man här beskriva att man tidigt gjort en kartläggning om hur många som skulle utbildas inom varje kassa eller är det att hamna på för mycket detaljer ??
Efter att den slutgiltiga införandeplanen fastställts började den omfattande planeringen med att fastställa utbildningsplanen.~~

I utbildningsplaneringen har bland annat ingått~~ingick bl.a.~~ att
⇒ Fastställa antal utbildningstillfällen på varje ort (med hänsyn till hur många som skulle utbildas)

~~□ Utbilda utbildare (lärare och assistenter) skall kanske nämnas under annan rubrik~~=JA DET TYCKER JAG

⇒ Tillsätta lärare och assistenter till varje utbildning

⇒ Upprätta en "jourlista" för lärare/assistent

⇒ Administration

3.3.1 Antal utbildningstillfällen på varje ort

Varje kassa tilldelades ett antal platser efter tidigare kartlagt utbildningsbehov. Delprojektet begärde därefter att få in anmälningar från varje kassa.

Utifrån inkomna anmälningar fastställdes antalet utbildningar som skulle genomföras på varje ort. Vissa extra platser, fanns tillgängliga till följd av att lokalerna inte nyttjades fullt ut. Dessa reserverades ~~för~~ handläggare som fick förhinder att delta vid a-kassans ordinarie utbildningstillfälle.

3.3.2 Tillsätta lärare och assistenter till varje utbildning

De av a-kassorna utsedda lärarna och assistenterna skulle i första hand utbilda personal från den egna a-kassan. Då alla a-kassor inte hade samma förutsättningar att få fram lärare och assistenter till utbildningarna har brist på lärare och assistenter funnits. Det har gjort att vissa lärare och assistenter även har fått leda utbildningar för andra a-kassor.

3.3.2.1 Kommentar

Bristen på lärare och assistenter har gjort att delprojektet fått lägga en hel del tid på att kontakta lärare och assistenter för att få dem att ta fler utbildningar mot vad som var planerat.

3.3.3 Upprätta jourlista för lärare och assistenter

För att undvika att utbildningar skulle behöva ställas in på grund av att ordinarie lärare och/eller assistent skulle få förhinder att genomföra sitt uppdrag upprättades en jourlista. Ett önskeläge hade varit att förse varje enskilt utbildningstillfälle med både ordinarie lärare/assistent och

jourlärare-/assistent. Detta var inte möjligt eftersom tillgången på lärare och assistenter har varierat, bland annat beroende på antalet utbildningar som genomförts samtidigt. Lösningen blev istället att en lärare/assistent fick vara jour för ett antal utbildningar grupperade efter var i landet de skulle äga rum.

3.3.3.1 Kommentar

Jourlistan har varit svårt att besätta, ~~på~~-dels på grund av brist på lärare/assistenter- ~~och dels på grund av~~ att man har haft svårt att åtaga sig extra uppdrag då ~~man-berörda personer~~ har behövts på den egna kassan efter det att man genomfört sina egna utbildningar och börjat arbeta i det nya systemet.

I och med att jourlistan har funnits och projektet i viss mån har kunnat förebygga för eventuella ”avhopp” har inga utbildningar behövts ställas in utan alla utbildningar har kunnat hållas enligt lagd plan!

3.3.4 Administration

Administration i samband med utbildningarna har skötts av ordinarie personal på SO. För att underlätta viss administration har t_{ex} kallelser till utbildningarna skickats ut till varje a-kassas OAS-general som sedan har haft till uppgift att distribuera ~~ut~~ kallelserna till varje enskild handläggare. Deltagarlistor och diplom (som varje handläggare fått efter genomförd utbildning) har skickats till varje lokalvärd som sedan har haft i uppdrag att lämna över det till ansvarig lärare vid respektive utbildning.

En form av supportorganisation har funnits under i stort sätt hela utbildningsperioden. ”Supporten” har haft i uppdrag att hjälpa lärare, värd m_{fl}. att lösa uppkomna problem i samband med utbildningarna. ”Supporten” har också haft ansvar för att vid ~~eventuell~~ sjukfrånvaro hos lärare eller assistent ordna ersättare utifrån den framtagna jourlistan som nämnts under rubrik ”Upprätta en jourlista lärare/assistent”. Man-Lärare/assistenter har nått ”supporten” via en jourtelefon. Det har även varit möjligt att nå supportorganisationen via mail. -för mindre akuta frågor har även möjlighet till kontakt funnits via mail. SO:s personal har haft ansvaret för bemanningen av jourtelefon samt att dagligen tömma mailbrevlådan.

3.4 Utbildningsmaterial

Delprojektet har haft ansvar för att ta fram utbildningsmaterial till utbildningarna i OAS 3. Utbildningsmaterialet har bestått av ett självstudiematerial och utbildningsmaterial innehållande övningsexempel att användas vid den lärarledda utbildningen, samt en s_k lärarpärm.

3.4.1 Självstudiematerial

Syftet med ~~att ta fram ett~~ självstudiematerialet var att höja förkunskapsnivån inför den lärarledda utbildningen och därmed utnyttja tiden maximalt. I självstudiematerialet fanns en avslutande självtest. Ett godkänt självtest förutsattes inför den lärarledda utbildningen för handläggarna.

Ansvaret för att självstudierna genomfördes och att testet klarades av har legat på deltagarna och respektive a-kassa.

3.4.1.1 Kommentar

Målet var att varje kassa skulle få självstudiematerialet distribuerat 3-4 veckor innan den lärarledda utbildningen. Självstudiematerialet tog längre tid att framställa än planerat, vilket fick till följd att de a-kassor som fick sin lärarledda utbildning under augusti inte hade samma förutsättningar att hinna ta del av självstudiematerialet som de a-kassor som fått sin utbildning senare under utbildningsperioden.

Materialet distribuerades till varje a-kassa i samband med ett OAS-generalsmöte den 14 augusti.

3.4.2 Utbildningsmaterial för handläggare

Den lärarledda utbildningen har varit ~~var~~ upplagd så på så sätt att ~~man varvade~~ teoripass har varvats med praktiska övningar. Utbildningsmaterialet ~~har~~ till största delen ~~bestod~~ bestått av övningsuppgifter.

De inom delprojektet anordnade grundkurserna har utnyttjat samma utbildningsmaterial.

Utbildningsmaterial till utbildning för handläggare med särskilda uppgifter (skuld-bokföring) har tagits fram av ordinarie personal på SO.

3.4.3 Lärarpärm/CD

Som stöd för lärare och assistenter har en s k lärarpärm tagits fram. Syftet med lärmaterialet har varit att ge stöd till läraren före, under och efter varje utbildningstillfälle. Innehållet har bestått av både allmänna tips/råd och rekommendationer i hur OAS 3-utbildningen bör bedrivas samt information om ”regelverket” kring lärares/assistentens uppdrag.

Projektet har också distribuerat en CD med i stort sett samma innehåll. Lärarpärmen/cd:n har bestått av följande innehåll

Innehåll	Beskrivning
Backupmaterial, powerpoint	Reservmaterial att använda i det fall kommunikationen med utbildningsdatabasen inte fungerar.
Checklista – lärare, Word	Checklista inför, under och efter utbildningar.
Faktureringsrutiner	Beskrivning av gällande överenskommelse vad gäller resor och traktamenten för lärare/assistenten samt hur tid ska redovisas.
Körschema	Utbildningsdagarna indelade i olika pass samt råd om vad som behöver tänkas på under varje pass.
Lista Tillgängliga användar-id och lösen	Fördelad på respektive utbildningslokal
Personnummerlistor, Word	Listor till kursdeltagarna att använda till övningsuppgifterna.

Innehåll	Beskrivning
Reseräkning – traktamente, Word	Dokument för utskrift vid behov. Dokument för utskrift vid behov.
Rättelser, Word	
Tidrapport, PDF	Dokument för utskrift vid behov
Utvärderingsblankett	

3.5 Genomförande av utbildningar

Delprojektet har planerat och genomfört utbildningar för följande målgrupper

- ⇒ Applikationsansvariga
- ⇒ Utbildare inom delprojektet (lärare och assistenter)
- ⇒ Handläggare på a-kassorna
- ⇒ Handläggare på a-kassorna med särskilda arbetsuppgifter (skuld – bokföring)
- ⇒ Grundutbildning för ”nya” handläggare på a-kassorna

Vid projektets start ingick i delprojektets åtagande att även utbilda följande målgrupper

- ⇒ Driftspersonal
- ⇒ Installationspersonal
- ⇒ Personal i ”helpdesk”

Utbildningsansvaret för dessa målgrupper har under projektets gång överförs till delprojekt Driftsättning.

3.5.1 Applikationsansvariga

Målsättningen var att de applikationsansvariga skulle få utbildning i god tid innan OAS 3 infördes på den egna a-kassan eftersom de skulle utgöra nyckelpersoner i införandet. Några har lett införandet på den egna a-kassan i egenskap av projektledare för den egna a-kassans införandeprojekt medan andra har utgjort en viktig resurs för denne.

I stort sett har utbildningen utförts enligt plan. Noteras kan dock att alla delar av OAS inte har kunnat gås igenom vid utbildningstillfället eftersom OAS 3 då inte var färdigutvecklat.

Delprojektet har utbildat ca 70 applikationsansvariga. Utbildningarna har genomförts av Lena Liljeqvist, Datarutin, Karl-Eric Spörndly, AEA och Dan Pöppel, SO.

3.5.2 Utbildning för utbildare inom delprojektet (lärare och assistenter)

Strategin har varit att utnyttja a-kassornas egen personal som lärare och assistenter. Eftersom dessa personer redan har insikt i arbetet på en a-kassa minskar inläringstiden och därmed ökar effektiviteten.

Ett mål har varit att kvalitén i utbildningarna skulle vara så hög som möjligt, vilket främjades av att utbildarna i delprojektet kände till verksamheten sedan tidigare. Den kompetens som byggts upp under införandet av OAS 3 kan a-kassorna tillgodogöra sig bl.a. i form av erfarna utbildare med omfattande kunskaper av OAS 3. Dessa kan exempelvis användas i den lokala förvaltningsorganisationen.

Gemensam utbildning har hållits för lärare och assistenter. Under våren 2002 har de kallats till utbildning i Stockholm under två dagar där dagarna ägnats åt att ”lära sig” OAS 3.

Efter semesterperioden har sedan alla lärare och assistenter kallats till en uppföljningsutbildning på 2 –3 dagar. Uppföljningsdagarna var upplagda så att dag 1 ägnades åt att åter gå igenom OAS 3. Dag 2 ägnades åt att gå igenom hur man skulle förbereda utbildningarna. För att underlätta för lärare och assistenter har en lärarpärm tagits fram, bland annat ett s k körschema. Det beskriver Vad som skall göras, Hur det skall göras och När det skall göras.

Dag 3 gavs lärarna och assistenterna möjlighet att självständigt få sitta och jobba mot de framtagna databaserna. Denna dag var frivillig att delta i.

I samband med uppföljningsutbildningen anordnades en kväll en social aktivitet för deltagarna, vilket har uppskattats.

Förutom ovan nämnda utbildning har de som fått uppdraget att vara lärare dessutom erbjudits en utbildningsdag i pedagogik. Syftet med denna utbildning var att ge kunskaper i att planera upplägget av utbildningen och att få pedagogiska tips om hur man som utbildare kan upprätthålla intresset för ämnet. Gunilla Gustavsson, Retorikhuset, anlätades för denna utbildning

Delprojektet har utbildat 57 lärare och 48 assistenter Utbildningarna har, exklusive pedagogikutbildningen, genomförts av Lena Liljeqvist, Datarutin, Karl-Eric Spörndly, AEA, Weronica Palmelin, HTF, Henrik Frihammar och Dan Pöppel, SO.

3.5.3 Utbildning av handläggare OAS Bas

Under veckorna 33-48 har alla utbildningar i OAS 3 för handläggare genomförts. Under samma period och i nära anslutning till utbildningarna i OAS 3 har även utbildningarna i skuld och bokföring genomförts samt grundkurs i OAS 3.

Delprojektet har utbildat ca 1100 handläggare. Utbildningarna har genomförts av personal från a-kassorna, personer som genomgått utbildningen för lärare och assistenter.

Alfakassan och industrifacken har själva arrangerat sina utbildningar, men projektet har haft ansvar för utbildningsmaterial och att utbilda deras lärare och assistenter.

3.5.4 Utbildning av handläggare med särskilda arbetsuppgifter

Utbildningarna i bokföring har genomförts Inger Öhrling, SO. Delprojektet har utbildat ca 70 personer.

Utbildningarna i skuldhantering har genomförts av Inger Öhrling, SO och Monika Bergqvist, AEA. Delprojektet har utbildat ca 100 personer.

3.5.5 Grundutbildning

Grundutbildningarna har genomförts av SOs ordinarie personal, Henrik Frihammar och Ann-Christine Olsson. Delprojektet har utbildat 30 personer.

3.5.6 Sammanställning av antalet utbildningar

Projektet har levererat ca 5000 utbildningsdagar fördelade enligt tabellen nedan

Typ av utbildning	Målgrupp	Omfattning (dagar)	Antal utbildningar	Antal deltagare, ca	Kommentar
Applikationsansvarig Grund + påbyggnad	De personer som på respektive arbetslöshetskassa utsetts till applikationsansvariga för OAS 3	2 + 2	2 + 6	70	
Utbildare inom delprojektet Grund + påbyggnad Lärare/assistenter	Personer som för delprojektets räkning kommer att utbilda eller medverka som assistenter vid handläggarutbildningarna	2 + 3	6 + 4	105	
Pedagogik	De personer som haft rollen som lärare har erbjudits en pedagogisk utbildning som har syftat till att ge kunskaper i att planera upplägget för en utbildning och ge pedagogiska tips om hur utbildaren kan upprätthålla intresset för ämnet.	1 (förlängd dag)	6	50	
Handläggare OAS Bas	Anställda av arbetslöshetskassorna som till någon del utför arbetsuppgifter i form av handläggning i OAS 3	3	140	1300	inklusive Alfakassan och Industrifacket, ca 200 personer. Tre dagar fördelade på en heldags självstudier samt två lärarledd med utbildning
Handläggare med särskilda arbetsuppgifter - Bokföring - Skuldhantering	Anställda av arbetslöshetskassorna som till någon del utför arbetsuppgifter i form av bokföring i OAS 3 Anställda av arbetslöshetskassorna som till någon del utför arbetsuppgifter i form av skuldhantering i OAS 3	1 1	8 11	70 100	

Typ av utbildning	Målgrupp	Omfattning (dagar)	Antal utbildningar	Antal deltagare, ca	Kommentar
Grundutbildning	Handläggare på kassorna som antingen är nyanställda eller kommit tillbaks efter en längre tids ledighet	3	3	30	

3.6 Utvärdering OAS Bas

3.6.1 Allmänt

I samband med utbildningarna för handläggare OAS Bas har utvärderingar från 26 utbildningstillfällen slumpmässigt begärts in under veckorna 35-43. Resultatet av utvärderingen grundar sig på 168 svar.

Syftet med utvärderingen var att **identifiera**:

- ◆ Akuta brister (vilket skulle ge delprojektet impuls om något behövde förändras omgående)
- ◆ Områden som eventuellt kommer att kräva kompletterande utbildningsinsatser
- ◆ Förbättringar till OAS 3 i kommande grundkurser som ordnas via SO

De områden som delprojektet ville få belysta var HUR handläggarna upplevt:

- ◆ Självstudiematerialet gällande innehåll, upplägg samt nyttan
- ◆ den lärarledda utbildningen gällande innehåll, upplägg, nytta samt lärarens insats
- ◆ administration/service före kursen.

Utvärderingen hade tre frågeställningar som skulle bedömas på en skala 1 – 4 där varje siffra hade följande bedömning

- 1 = Missnöjd
- 2 = Mindre nöjd
- 3 = Nöjd
- 4 = Mycket nöjd/över förväntan


Till varje fråga fanns även möjlighet att lämna kommentarer. De kommentarer som lämnats har varit rätt omfattande, och dessa finns sammanställda och finns med som bilaga till slutrapporten.

De kommentarer som återkommit i många av utvärderingarna finns redovisade under respektive frågeställning.

Allmänna kommentarer som tagits upp i flera av utvärderingarna är:

- ”OAS 3 handboken väldigt bra”
- ”Duktiga, tålmodiga lärare”

3.6.2 Resultat Självstudiematerialet

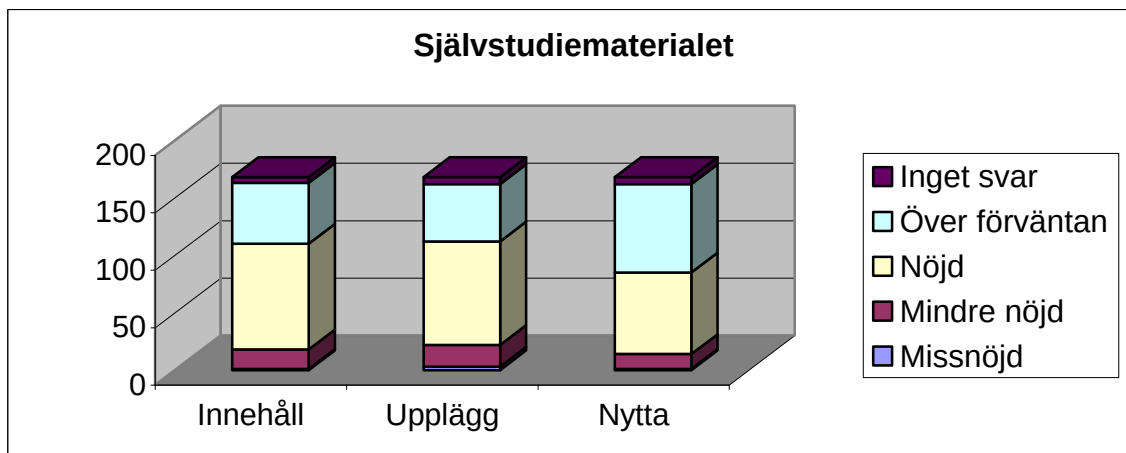


3.6.2.1 Kommentar till frågorna om självstudiematerialet

Följande kommentarer har återkommit i flera av utvärderingarna

- ”Var en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen”
- ”Bra att kunna förbereda sig hemma”
- ”Bra att få överblick av OAS 3”

Det har lämnats en hel del ”tips” om att utveckla självstudiematerialet. Sammanställningen av utvärderingarna kommer att lämnas över till förvaltningsorganisationen.

3.6.3 Resultat Lärarledd utbildning

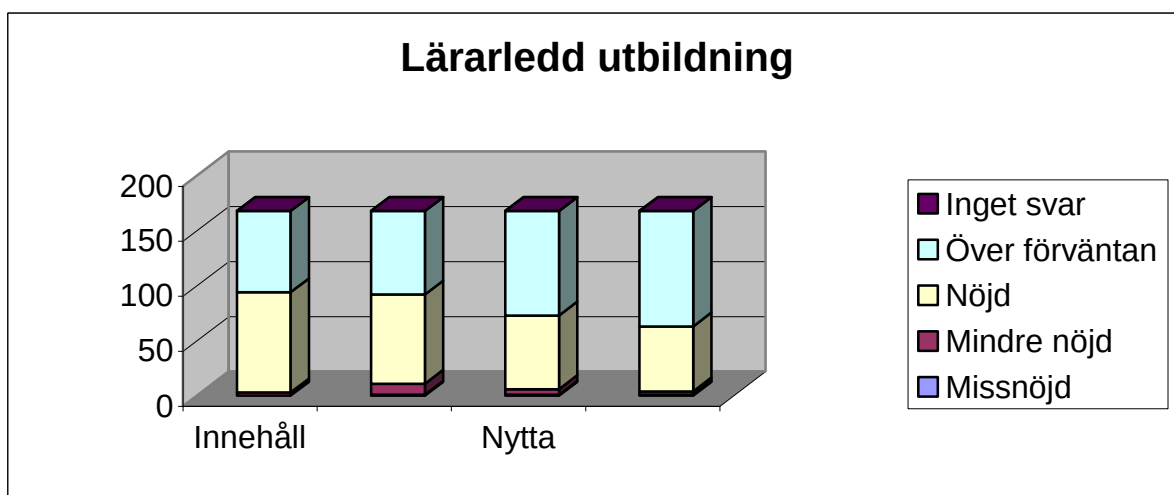


3.6.3.1 Kommentar till frågorna om den lärarledda utbildningen

Följande kommentarer har återkommit i flera av utvärderingarna

- ”Bra lärare”
- ”Bra med både lärare och assistent”

3.6.4 Resultat Administration/Service

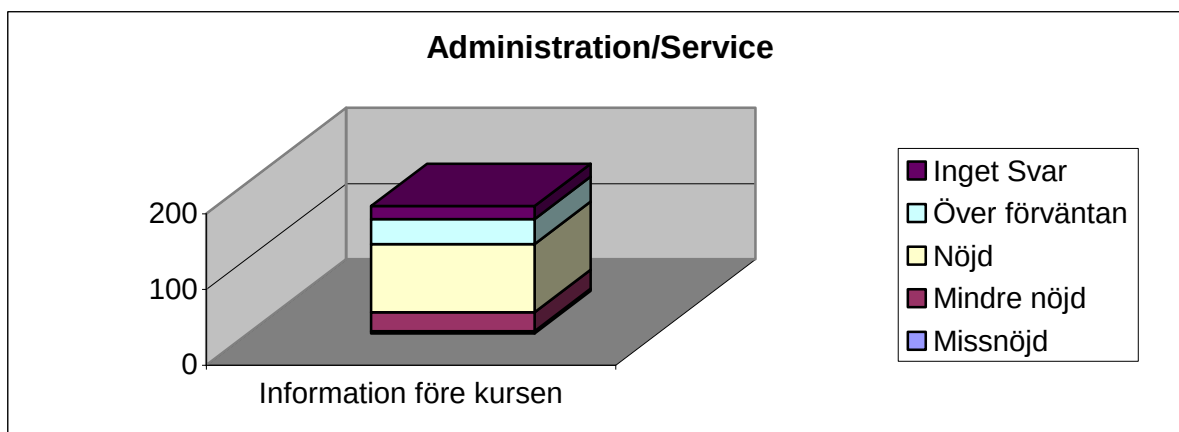

3.6.4.1 Kommentarer till administration/service före kursen

Följande kommentarer har återkommit i flera av utvärderingarna

- ”Sent utskick av självstudiematerialet
- ”Ej fått information om att det finns handbok”
- ”Sent med kallelser”

3.7 Utvärdering Pedagogikutbildning

I samband med utbildningen i pedagogik för lärare har en utvärdering gjorts. Bedömningen från deltagarna har varit enhällig. Sammantaget kan man säga att de upplevt satsningen som mycket givande inför sitt uppdrag som lärare. En av frågeställningarna i utvärderingen var

”Vad är det viktigaste du tar med dig från utbildningen?”

På den frågan har vi tagit ut några citat som kan ses som en ”röd tråd” i utvärderingen

- ”Man vågar mera i rollen som lärare”
- ”Att våga och att lära ut med glädje”
- ”Jag har fått tips och idéer hur framförandet kan göras”
- Jag har lärt mig hantera en grupp som avbryter och frågar”
- ”Har lärt mig att tala lugnt och högt”

3.7.1.1 Kommentar

Att göra en satsning på att ge alla lärare en dags utbildning i pedagogik inför sitt uppdrag måste ses som lyckad, med hänsyn dels till resultatet i utvärderingen (pedagogik) och dels till resultatet i utvärderingen (OAS basutbildning)

4 Uppföljning av projektet

4.1 Tid, resurser och kostnader

Nedan presenteras en sammanställning av det preliminära utfallet av kostnader för delprojektet. Kostnaderna ligger inom ramen för lagd budget.

Preliminärt utfall												
	Ettapp 1		Ettapp 2		Ettapp 3		Ettapp 4		Ettapp 5		Totalt	
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall
Externa konsulttimmar, Resco			0	50	170	200	190	220	375	375	735	845
Externa konsulttimmar, Datarutin			100	69	370	251	125	220	10	36	605	576
Externa konsulttimmar, Active Solution					0	59	150	228	0	81	150	368
Summa			100	119	540	510	465	668	385	492	1 490	1 789
SO/OAS-resurser (timmar)	0	24	30	10	280	200	250	560	830	410	1 390	1 204
Resurser från A-kassorna (timmar)	120	95	810	431	2 235	597	1 400	1 880	6 900	5 500	11 465	8 503
Kostnader (tkr)	0	0	130	275	250	88	685	264	1 770	1 400	2 835	2 027

4.1.1 Kommentarer

4.1.1.1 Ettapp 2

Kostnad för pedagogikutbildning blev dyrare än planerat eftersom budgeterad kostnad baserades på pris för 1 dag, 6 tim. Utbildningen omfattade 1 dag, 10,5 tim.

Kostnader för resor och logi för a-kassans personal var inte med i den ursprungliga budgeten.

4.1.1.2 Ettapp 3

Mindre utnyttjande av resurser från a-kassornas personal än budgeterat beror på ändrade planer för genomförandet av lärar- och assistentutbildningen.

4.1.1.3 Ettapp 4

Utnyttjandet av Sos personal blev större än budgeterat, på grund av att kursadministration och framtagandet av självstudiematerialet tog längre tid än beräknat.

Differens i timutnyttjande vad gäller a-gällande a-kassornas personal beror på ändrad utbildningsstrategi för lärare och assistenter.

Differens i kostnader beror på att färre resor än planerat har gjorts av a-kassans personal samt att planerad pedagogikutbildning inte genomfördes.

4.2 Organisation/samarbete och arbetssätt

I delprojektet tillsattes en projektledare. Efterhand som delprojektet fortskred insåg man att det behövdes fler resurser på grund av dess omfattning. Resurs från Resco har funnits med sedan mitten av mars 2002. Fr. om juni utökades delprojektet med ytterligare en resurs tillika projektledare.

Delprojektet har haft möten ca 1 ggr/v från juni månad. Sos personal, som i olika skeden har haft uppdrag inom delprojektets ansvarsområden, har deltagit på dessa möten

För att underlätta kontakter med bland annat lärare och assistenter har delprojektet lagt upp s k gruppmailsadresser, för att på ett snabbt och effektivt sätt kunna nå ut med viktig information.

En annan informationskanal till a-kassorna har varit det s k "veckobrevet". Ansvarig för "veckobrevet" har varit delprojektet Driftsättning.

I samband OAS-generalsmöten har projektet också informerat om hur delprojektet fortskridit.

5 Rekommendationer

Strategin har varit att utnyttja a-kassornas egen personal som lärare och assistenter. Eftersom både lärare och assistenter redan har en insikt i arbetet på en a-kassa minskar inlärningstiden och därmed ökar effektiviteten.

I samband med den utvärdering som gjorts kan man tydligt se på de svar som inkommit att handläggarna upplevt både lärare och assistenter som kompetenta. Bedömningen blir därför att strategin ser ut att vara riktig.

En synpunkt som projektgruppen har är att, eftersom så många har varit inblandade i rollen som lärare och assistenter, det har inneburit väldigt mycket arbete i form av administration, vilket kostat både tid och pengar.

Synpunkter från framförallt en del lärare har varit att de har upplevt uppdraget som stimulerande, men att man gärna skulle velat hålla fler utbildningar för att bli "riktigt varm i kläderna" Hindret för att ta fler uppdrag har varit att man har behövts på den "egna kassan" efter införandet av OAS 3 på den "egna kassan".

Varje a-kassa har i och med den satsning som gjorts på lärare och assistenter höjt kunskapsnivån både avseende OAS3 och för lärarna även allmänna pedagogiska kunskaper. Det är viktigt att ta tillvara denna kompetens. Dessa personer måste kunna ses som resurser som SO skulle kunna ta anlita vid tex. fortsatt utvecklingsarbete av OAS 3

När det gäller utbildning för den stora gruppen handläggare i det nya systemet OAS 3, kan man också se att strategin med att inför den lärarledda utbildningen ha läst in ett självstudiematerial har upplevts som ett bra sätt att ha fått vissa förkunskaper vilket underlättat själva inläringen.

6 Referensmaterial

- Utbildningsstrategi version 1.3
- Delprojektplan - dokument för etapperna 1-4.
- Utbildningsplan version 1.7
- Resursuppföljning
- Sammanställning kursutvärdering, utbildning handläggare Bas
