

Innehållsförteckning

1 Allmänt	2
2 Förutsättningar	2
3 Konverteringsmiljöer	2
4 Översikt	3
5 Olika konverteringar	4
5.1 Systemtestkonvertering	4
5.2 Acceptanstestkonvertering	4
5.3 Provkonvertering	5
5.4 Driftskonvertering	5
6 Grov plan	6
7 Fortsatt arbete	6
7.1 Konverteringsinstruktioner	6

1 Allmänt

Syftet med denna konverteringsstrategi är att fastställa ett antal principer för det fortsatta arbetet avseende registerinformation och konvertering.

Principerna kommer att konkretiseras och vara riktlinjer i det fortsatta arbetet.

Driftskonverteringar planeras genomföras under vecka 35 - 45 för cirka 3 750 000* medlemmar uppdelade på 38 a-kassor. (* Uppgifterna from 31/3 2001 – ALFA kassans icke anslutna).

Dokumentet beskriver översiktligt:

- förutsättningar för att genomföra konverteringen.
- konverteringsmiljöer.
- de olika konverteringar från systemtestkonvertering till driftskonvertering
- grov plan för de olika konverteringarna samt för rensning och rättning av registerinformation.

Instruktioner vad som ska göras före, under och efter konverteringen på driftstället och kassan beskrivs i separata dokument.

Konvertering inför pilotdriften på SEKO har redan genomförts till stora delar och beskrivs ej i detta dokument.

2 Förutsättningar

Förutsättningar för att driftskonverteringen ska kunna genomföras på ett tillfredställande sätt är:


- att maskinell och manuell rensning genomförts på samtliga kassor innan provkonvertering enligt givna instruktioner.
- att acceptanstestkonvertering genomförs med godkänt resultat.
- att med fel- och åtgärdslistor från provkonverteringen som underlag rätta registerinformation i OAS 2.8 på samtliga kassor innan driftskonverteringen genomförs.

3 Konverteringsmiljöer

Datorkörningar för systemtestkonvertering görs i den miljö som utvecklingsprojektet bestämmer, acceptanstestkonvertering görs i acceptanstestmiljön, datorkörningar för provkonvertering och driftskonvertering görs i den miljö som respektive driftsställe och respektive kassa kommer överens om.

4 Översikt

Skissen visar översiktligt vad som görs i OAS 2.8 och OAS 3.0.

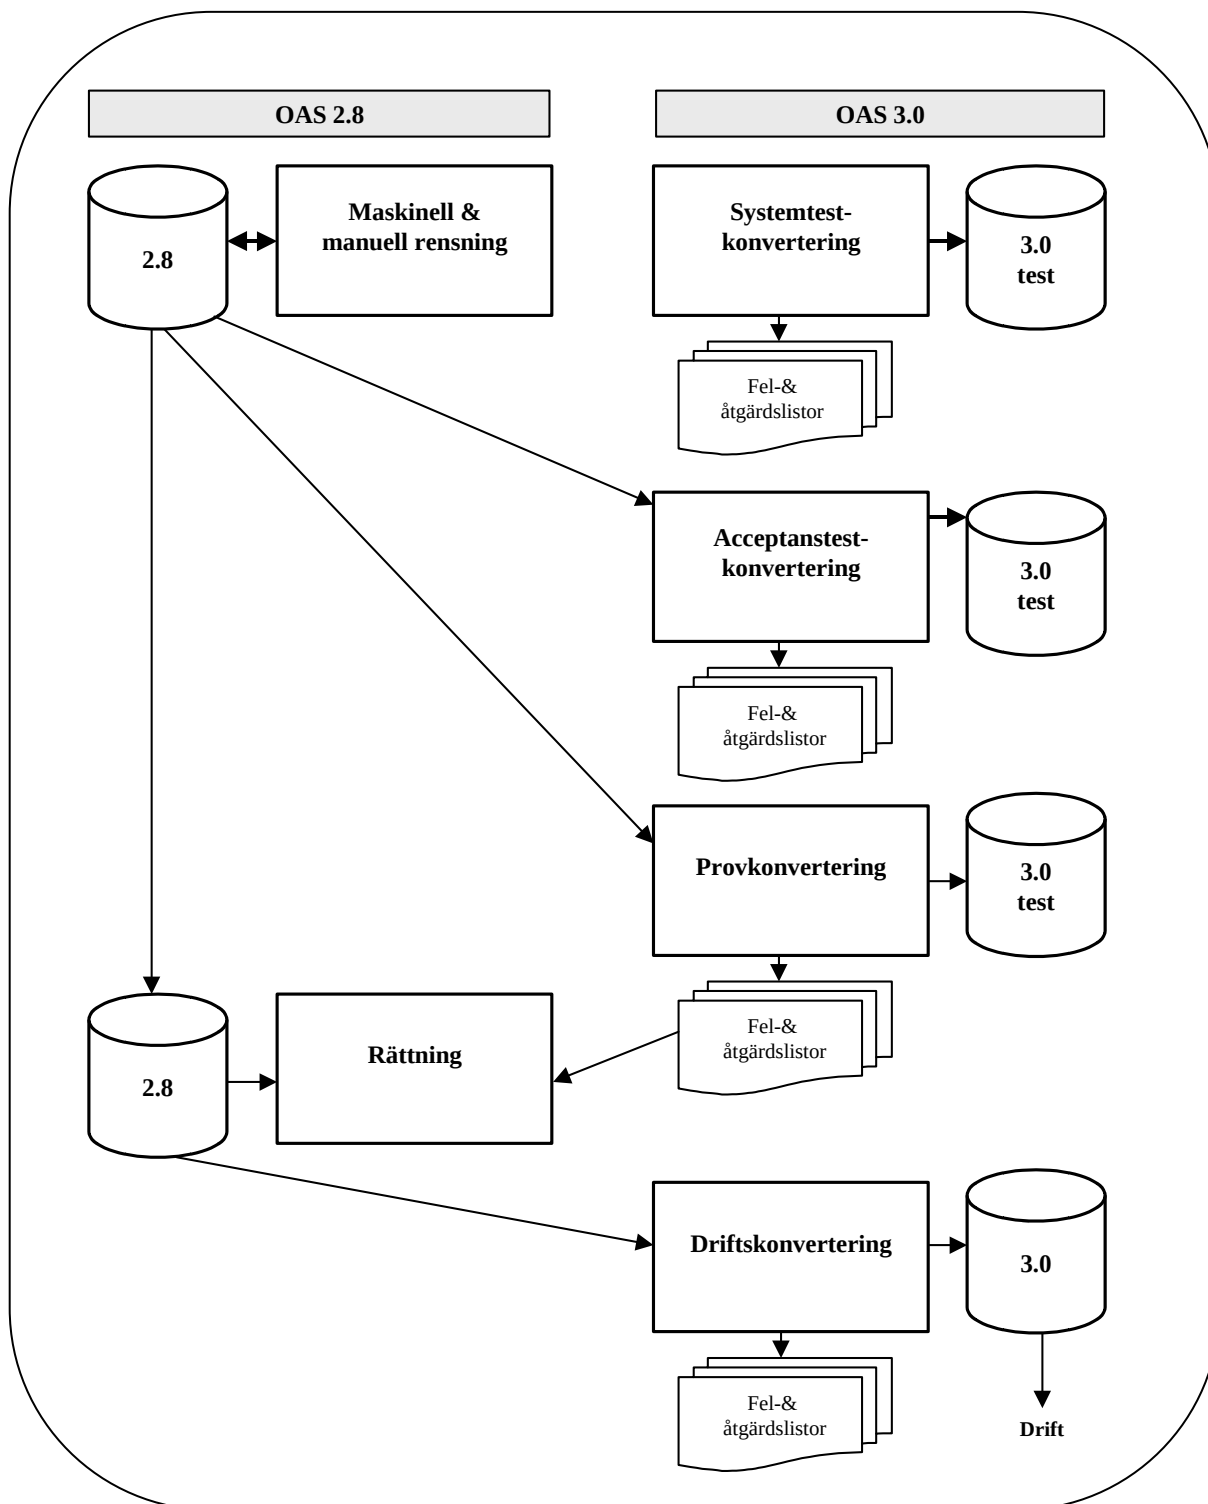

5 Olika konverteringar

5.1 Systemtestkonvertering

Ansvarig: Utvecklingsprojektet

Utvecklingsprojektet testar att samtliga konverteringsprogram, avstämningar av räknare och ackumulatorer samt utskrifter av fel- och åtgärdslistor fungerar enligt överenskomna förutsättningar.

Syftet med denna konvertering är att:

- att testa fastställda konverteringsregler
- att testa avstämning av ackumulatorer/databashantering.
- att stämma av räknare samt skapa ut fel- och åtgärdslistor.
- att upptäcka eventuella brister i datakvalitet som behöver åtgärdas.
- att stämma av beteende.

5.2 Acceptanstestkonvertering

Ansvarig: Införandeprojektet delprojekt Acceptanstest

Konverteringen är en fullständig konvertering av information inklusive allt generellt data (beslutstyper, behörigheter, koder mm) som behövs för att köra applikationen.

Syftet med denna konvertering är:

- att verifiera konverteringsreglerna.
- att verifiera registerinformationen.
- att eventuellt anpassa konverteringsreglerna.
- att uppdatera databasen med verkligt material.
- att skriva ut användarvänliga fel- och åtgärdslistor.
- att säkerställa koppling mot externa system.
- att upptäcka eventuella brister i datakvalitet som behöver åtgärdas.

Vidare ingår att testa att applikationen uppträder på rätt sätt med det konverterade datat, dvs att konverteringen laddar in data på det sätt som applikationen förväntar sig.

5.3 Provkonvertering

Ansvarig: Driftstället och applikationsansvarig på a-kassan.

Konverteringen är en fullständig konvertering av respektive kassas information inklusive allt generellt data (beslutstyper, behörigheter, koder mm) som behövs för att köra applikationen. Konverteringen görs under produktionsliknande förhållanden. Databasen bör vara definierad volym- och prestandamässigt enligt den tänkta driftsdatabasen.

Syftet med denna konvertering är:

- att skapa fel- och åtgärdslistor på information som bör rättas före driftskonverteringen.
- att säkerställa att det är rimliga körningstider.
- att verifiera att applikationen fungerar tillfredsställande när flera kassor genomför en fullständig konvertering.
- att testa implementeringen av databasen med data i full skala.
- att skapa realistiskt testmaterial i verkliga volymer för att testa applikationens och databasens prestanda både online och batch.
- att säkerställa applikationens och databasens prestanda.

Provkonverteringen kan även delas upp i två steg där det första steget görs för att kassan ska få en möjlighet att verifiera data enligt checklistor och rätta fellicitor mm. Andra steget kallas då provdrift och görs för att verifiera prestanda och batchkörningar mm.

5.4 Driftskonvertering

Ansvarig: Driftstället och applikationsansvarig på a-kassan.

Driftskonvertering är en fullständig konvertering av en kassas information inklusive allt generellt data (beslutstyper, behörigheter, koder mm) som behövs för att köra applikationen. Konverteringarna sker i takt med att kassorna går över till OAS 3.

6 Grov plan

	maj			juni			juli			aug			sep			okt			nov										
Aktivitet	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	Anm
Maskinell & manuell rensning																													
Systemtestkonvertering																													
Acceptanstestkonvertering																													
Provkonvertering																													
Rättning																													
Driftskonvertering																													

7 Fortsatt arbete

7.1 Konverteringsinstruktioner

Utforma instruktioner som beskriver vad som ska göras före, under och efter konverteringen på driftstället och på kassan.
