


Innehållsförteckning

1	Omläggningsmodell	2
2	Omläggning – aktivitetsplan förklaringar	3
2.1	Kassa	3
2.1.1	Provdraft	3
2.1.2	Utbildning & utvärdering	4
2.1.3	Driftstart	4
2.2	Driftställe	5
2.2.1	Provdraft	5
2.2.2	Driftskonvertering & omställning	6
2.2.3	Driftstart	6
2.3	Stopp	7
3	Hålltider för kassorna	8
4	Hålltider för driftställena	9

1 Omläggningsmodell

Figuren visar de olika stegen för respektive kassa och driftställe, beslutspunkter samt vid vilka tillfällen återrapportering till SO ska göras (hålltider).

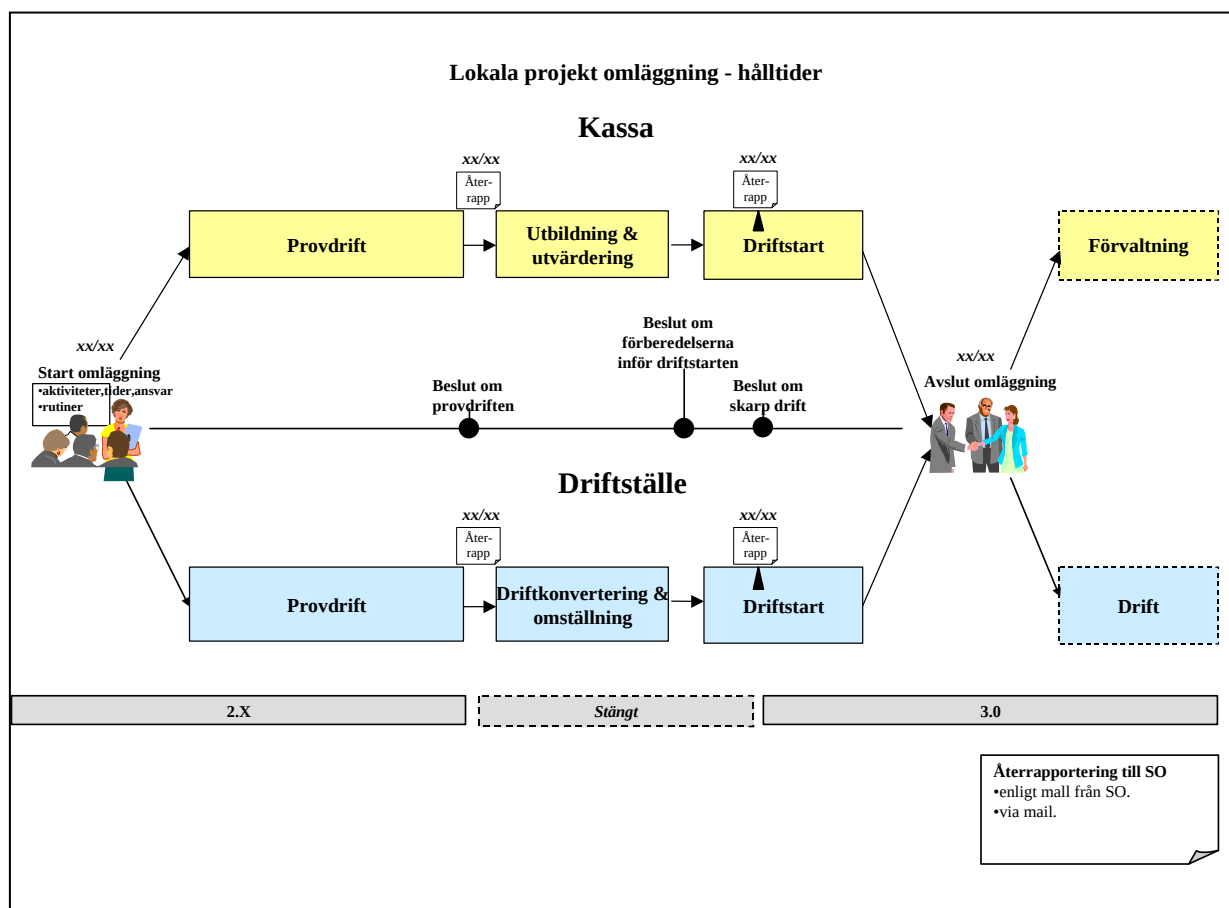

2 Omläggning – aktivitetsplan förklaringar

Under denna rubrik förklaras ingående aktiviteter i Omläggning – aktivitetsplan.

2.1 Kassa

2.1.1 Provdraft

Aktivitet	Förklaring	Anm
Planera omläggningen på kassan	Säkerställ att aktiviteterna inför omläggningen är avslutade. Fastställ när respektive aktivitet ska vara klar och när den kan starta, vem som ska utföra arbetet samt informera berörda personer.	
Anpassa brevmallar o texter	Skiljer sig från OAS 2, se över och anpassa.	
Klientinstallationer	Följ upp att samtliga klientinstallationer är genomförda enligt rekommendationerna.	
Verifiera klientinstallationer	Verifiera att den senaste versionen av OAS 3, ADMIN-klienten och Behörighetssystemet är installerad på samtliga klienter.	
Förbered parametersättning	Om det inte är gjort vid provkonverteringen. Se Handbok för ADMIN-klienten och Förteckning över Brevvariabler.	
Förbered behörigheter	Med arbetsrutinerna som underlag förebered registrering av behörigheter. Se Behörighetssystem – Handbok.	
Förbered konverteringsverifiering (Impromptulistor från OAS 2)	Se Konverteringsinstruktionerna.	
Verifiera provdriftskonverteringen	Se Konverteringsinstruktionerna.	
Applikationsuppsättning provdrift (parametersättning, behörigheter, brevmallar m m)	Om det är gjort vid provkonverteringen så räcker det att verifiera applikationsuppsättningen. Annars krävs det att man lägger upp alla parametrar m m.	
Verifiera applikationsuppsättningen (enligt checklisten)	Se checklista för Applikationsuppsättning på kassan.	
Kontrollera brevutskrifter	Skriv ut samtliga brev samt kontrollera utformning och text.	
Förbered provdrift på kassan	Förbered för en volymbegränsad del av ärenden att testa handläggning i OAS 3. Fastställ batchkörningar.	
Översyn felrutiner på kassan	Se till att det finns lämpliga rutiner för att hantera fel och förbättringsförslag.	
Specialanpassningar kassan	Stäm av med driftstället vilka specialanpassningar av kringssystem som ska göras.	
Provdraft på kassan (handläggning av ärenden m m)	Genomför provdriften enligt förberedelserna och verifiera batchkörningsresultaten.	
Bevaka Självstudier	Bevaka att självstudier görs före handläggarutbildningen.	
Säkerställ handläggarutbildning	Säkerställ att handläggarna kommer att delta som planerat.	
Prestanda-/belastningstest	Planera, förbered och genomför test av svarstider.	
Utvärdera provdriften på kassan	Följ upp resultatet från provdriften på kassan, ta fram rekommendation till beslut om provdriften.	

2.1.2 Utbildning & utvärdering

Aktivitet	Förklaring	Anm
Anpassa arbetsrutiner	Stäm av arbetsrutiner och arbetsfördelning och gör anpassningar inför skarp drift.	
Förbered konverteringsverifiering (Impromptulistor från OAS 2)	Se Konverteringsinstruktionerna.	
Förbered provkörning i driftsmiljön	Ta fram underlag för funktionskontroll och stickprovskontroll vid driftstarten.	
Förbered verifiering av kringssystemen	Ta fram underlag för att kunna verifiera samtliga kringssystem vid driftstarten.	
Avsluta pågående ärenden i OAS 2	Avsluta så många pågående ärenden som möjligt samt gå igenom fellistor.	
Avslutande avstämning i OAS 2 (SUS-fil,statsbidragsansökan)	Stäm av de sista batchkörningarna i OAS 2.	
Verifiera driftskonverteringen	Se Konverteringsinstruktionerna.	
Bevaka handläggartutbildning	Bevaka om handläggare inte är med på utbildningen som planerat och vidta lämpliga åtgärder.	
Behörighetsöversyn	Se över om behörigheterna behöver justeras efter provdriften.	
Översyn parametersättningen	Se över om parametrarna behöver justeras efter provdriften.	
Lägesrapport om förberedelserna inför driftstarten	Rapportera till beslutsfattarna om planerade aktiviteter genomförts med godkänt resultat eller om det är några avvikelser.	
Beslut om förberedelserna inför driftstarten	Besluta om det är OK att fortsätta omläggningen som planerat eller om icke planerade åtgärder ska vidtas.	

2.1.3 Driftstart

Aktivitet	Förklaring	Anm
Applikationsuppsättning skarp drift (parametersättning,behörigheter, brevmallar m m)	Vid behov anpassa parametrar från provdriften	
Behörighetsregistrering (skapa behörighetsgrupper)	Se Behörighetssystem – Handbok.	
Verifiera applikationsuppsättningen (enligt checklisten)	Verifiera i driftsmiljön. Se checklista för Applikationsuppsättning på kassan.	
Provkörning i driftmiljön	Gör funktionskontroll och stickprovskontroll enligt förberedelserna.	
Säkerställ användarstöd	Säkerställ användarstödet i samband med driftstarten.	
Distribution av användarnamn och lösenord	Till samtliga användare.	
Tittbehörigheter i OAS 2	Ändra till ”tittbehörighet” för samtliga användare i OAS 2. Verifiera att endast ”tittbehörighet” gäller.	
STARTA SKARP DRIFT OAS 3		
Driftskonvertering fortsatt verifiering/kontroll	Se Konverteringsinstruktionerna.	
Koppla användare till behörighetsgrupp	Se Behörighetssystem – Handbok.	

2.2 Driftställe

2.2.1 Provdrift

Aktivitet	Förklaring	Anm
Planera omläggningen på driftstället	Fastställ när respektive aktivitet ska vara klar och när den kan starta, vem som ska utföra arbetet samt informera berörda personer.	
Iordningställ provdriftsmiljö	UNIX-server, hårdvara, systemprogram serverprogram och databas för OAS 3.	
Uppsättning batchmonitor	T ex JQTools.	
Driftp Anpassningar (organisation,rutiner,dokumentation)	Inklusive efterbehandling och printning.	
Översyn konverteringsförutsättningar	Se över och anpassa vid behov koder (beslut, intyg) m m från provkonverteringen.	
Förbered provdriftskonvertering (återläsning parametrar,preparering)	Återläsning av parametrar m m från provkonverteringen och preparering av körningar.	
Provdraftskonvertering körningar	Se Konverteringsdokumentation OAS 2 till OAS 3.	
Anpassa kringsystem (SOTA,A-kassan Online m fl)	Anpassning av metoder för klientinstallationer som är standard.	
Fastställ körplan provdrift	Ta fram schema för batchkörningar som ingår i provdriften.	
Översyn felrutiner på driftstället	Se till att det finns lämpliga rutiner för att hantera fel och förbättringsförslag.	
Rutiner, utbildning Helpdesk	Se till att det finns rutiner för Helpdesk och att personalen har tillräcklig OAS 3 kompetens.	
Specialanpassningar driftstället	Anpassning av metoder för klientinstallationer som ej är standard.	
Provdraft på driftstället (batchkörningar m m)	Test av drifrutiner (inklusive efterbehandling och printning), backup/restore, övervakning, drift-dokumentation m m.	
Spara konverteringsförutsättningar	Från provdriften.	
Spara parametrar, brevmallar m m	Spara inför driftskonvertering.	
Prestanda-/belastningstest	Planera, förbered genomför och följ upp test av svarstider och tider för batchkörningar.	
Utvärdera provdriften på driftstället	Följ upp resultatet från provdriften på driftstället, ta fram rekommendation till beslut om provdriften.	

2.2.2 Driftskonvertering & omställning

Aktivitet	Förklaring	Anm
Iordningställ driftskonverteringsmiljö	UNIX-server, hårdvara, systemprogram serverprogram och databas för OAS 3.	
Översyn konverteringsförutsättningar	Se över och anpassa vid behov koder (beslut, intyg) m m från provdriftskonverteringen.	
Förbered driftskonvertering (återläsning parametrar m m,preparering)	Återläsning av parametrar m m från provdriftskonverteringen och preparering av körningar.	
Avslutande batchkörningar i OAS 2 (SUS-fil,statsbidragsansökan)	Kör de sista batchkörningarna i OAS 2.	
Fastställ körplan skarp drift	Ta fram schema för batchkörningar för skarp drift	
Driftskonvertering körningar	Se Konverteringsdokumentation OAS 2 till OAS 3.	
Spara parametrar m m	Spara inför skarp drift.	
Lägesrapport om förberedelserna inför driftstarten	Rapportera till beslutsfattarna om planerade aktiviteter genomförts med godkänt resultat eller om det är några avvikelser.	
Beslut om förberedelserna inför driftstarten	Besluta om det är OK att fortsätta omläggningen som planerat eller om icke planerade åtgärder ska vidtas.	

2.2.3 Driftstart

Aktivitet	Förklaring	Anm
Iordningställ driftsmiljö	UNIX-server, hårdvara, systemprogram serverprogram och databas för OAS 3.	
Driftförberedelser skarp drift (återläsning parametrar m m)	Återläsning av parametrar m m driftkonverteringen.	
Etablera Helpdesk	Se till att Helpdesk för OAS 3 är i funktion.	
Backup databaser m m	Före provkörning i driftmiljön.	
Restore databaser m m	Efter provkörning i driftmiljön.	
Ikappkörning batchar (minimedlem,kassakort etc)	Batchkörningar som måste köras innan driftstart för OAS3 på kassan.	

2.3 Stopp

Aktivitet	Förklaring	Anm
Lägesrapport om ...	Rapportera till beslutsfattarna om planerade aktiviteter genomförts med godkänt resultat eller om det är några avvikelser.	
Beslut om ...	Besluta om det är OK att fortsätta omläggningen som planerat eller om icke planerade åtgärder ska vidtas.	
Återrapportera till SO	Rapportera beslutet till SO enligt mall från SO på mailadress oml@samorg.org	
Informera intressenter	Informera om beslutet.	

3 Hålltider för kassorna

Kassa	Återrapportera till SO		Anm
	Stopp 1 vid provdrift	Stopp 2 vid driftstart	
FEAK	23/8	28/8	
FAK	”	”	
Grafiska arb	”	”	
Pappers	”	”	
Skogs- o Trä	”	”	
Farmaci	30/8	4/9	
Finansförb	”	”	
Försäktjmän	”	”	
KA	”	”	
Ledarnas	”	”	
MUA	”	”	
SHA	”	”	
SLAK	”	”	
Säljarnas	3/9	6/9	
EAK	6/9	11/9	
Hamnarb	”	”	
HTF	”	”	
PEAK	”	”	
Byggnads	10/9	13/9	
Handels	13/9	17/9	
AEA	13/9	18/9	
SIFAK	20/9	25/9	
Transport	27/9	2/10	
Hotell- o rest	1/10	4/10	
Målarnas	”	”	
Metall	4/10	9/10	
Journalisternas	15/10	18/10	
Lärarnas	”	”	
SmåA	”	”	
KAAC	16/10	24/10	
Livs	22/10	25/10	
SEA	”	”	
TAK	”	”	
Industrifacket	29/10	1/11	
SAAC	”	”	
Alfa-kassan	5/11	8/11	
Sv Fiskares	22/11	27/11	

4 Hålltider för driftställena

Avstämning och återrapportering sker vid veckovisa möten med SO under omlägningsperioden.
